

关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程 项目绩效评价报告

主管部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会
自然资源规划建设局

委托单位：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2024年12月



摘 要

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，河南云域网络科技有限公司受新乡高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）财政局委托，对“关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程项目”开展绩效评价，形成此报告。

该项目主要实施内容为新建水泥路面 112 m²，破除、修补水泥砼路面 7655 m²，铺设沥青路面 48867 m²（厚度 7cm），新建路缘石 15220m（规格 100×15×27cm），新设交通标线 2030 m²等。项目已于 2023 年 8 月 15 日竣工验收并投入使用。该项目建设总投资约 700.00 万元，经评审中心核算后审定工程价 580.69 万元，截至 2024 年 12 月，已支付项目工程款共计 450.00 万元，预算执行率达到 77.49%。项目的建设切实改善了村民出行条件，有效提升道路通行能力。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 89.08 分，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。

总体来看，该项目立项依据充分，立项程序规范；项目资金管理层面，预算编制科学合理，资金使用过程合规；过

程管理方面，招投标手续齐全，合同管理基本规范；产出层面，项目整体完成度较高，已正常投入使用；效益方面，完善了区域交通环境，进一步满足居民日常出行需求，整体满意度达到 99.42%。该项目的建设将切实改善村民出行条件，同时对完善区域路网结构，提升道路通行能力，拓展城市发展空间，促进高新区经济发展都具有重要意义。

但是从评价组调研情况来看，项目还存在一些不足：1. 绩效管理工作不够规范；2. 资金支付进度较为缓慢；3. 项目后续管护制度不到位。

针对以上问题，评价组提出以下改进建议：1. 根据项目实际情况填报绩效；2. 切实保障资金支付进度；3. 加强项目后续监督管理。

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价依据	6
(三) 评价指标体系	8
(四) 绩效评价原则、方法和标准	11
(五) 绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论	15
(一) 综合评价情况	15
(二) 评价结论	16
四、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	26
五、主要经验及做法、存在的主要问题	27
(一) 主要经验及做法	27
(二) 存在的主要问题	28

六、有关建议.....	29
(一) 根据项目实际情况填报绩效.....	29
(二) 切实保障资金支付进度.....	30
(三) 加强项目后续监督管理.....	30
七、其他需要说明的问题.....	30
八、附件.....	31
附件 1：评价指标体系及评分表.....	32
附件 2：满意度调查问卷.....	56
附件 3：满意度调查分析报告.....	59

关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，河南云域网络科技有限公司受新乡高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）财政局委托，对“关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程项目”开展绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

关堤乡位于新乡市高新区东南部，东邻古固寨镇，南接朗公庙镇，西与洪门镇相连，北与新乡市经开区小店镇接壤。青年路（Y001乡道）作为贯穿关堤乡的重要道路之一，长约7公里，与227省道和229省道相交汇，全线路段连接着关堤乡14个行政村，对于村民来说，这条道路是每日出行的必经之路，地理位置至关重要，承载着区域交通动脉。由于年久失修，特别是近几年时常经历暴雨冲刷，部分路面已坑洼不平，多处出现路面裂缝、错台等，严重影响周边群众的出行安全。

近年来，各级政府积极推动“四好农村路”建设，大力改善农村公路交通条件，助力农村产业发展。高新区关堤乡

人民政府从完善基础设施建设，拓展发展空间和改善居民出行条件的宗旨出发，提出该项目的建设计划，目的在于对关堤乡青年路（Y001乡道）原有道路状况进行改造提升工程。项目建设之后，将切实改善村民出行条件，同时对完善区域路网结构，提升道路通行能力，拓展城市发展空间，促进高新区经济发展都具有重要意义。

2. 项目主要内容及实施情况

该项目主要实施内容为：新建水泥路面 112 m²，破除、修补水泥砼路面 7655 m²，铺设沥青路面 48867 m²（厚度 7cm），新建路缘石 15220m（规格 100×15×27cm），新设交通标线 2030 m²等。截至 2024 年 12 月，项目已竣工验收并投入使用，切实改善村民出行条件，有效提升道路通行能力。

3. 项目资金来源及支出情况

（1）项目资金来源情况

根据《关于关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程可行性研究报告的批复》（新开经〔2023〕68号）文件内容，该项目建设总投资约 700.00 万元，其中争取省补助资金 252.00 万元，区级财政资金 448.00 万元。

（2）项目资金支出情况

该项目工程结算审核表报送金额为 614.00 万元，经评审中心核算后审定工程价 580.69 万元，项目实际建设成本为 580.69 万元，截至 2024 年 12 月，已支付项目工程款共计 450.00 万元，执行率达到 77.49%。项目资金支出明细如下表

1-1 所示。

表 1-1 项目资金支出情况明细表

序号	资金用途	支付时间	支付金额（万元）
1	第一笔工程款	2023 年 11 月 27 日	100.00
2	第二笔工程款	2023 年 12 月 22 日	50.00
3	第三笔工程款	2024 年 2 月 7 日	100.00
4	第四笔工程款	2024 年 5 月 31 日	200.00
总计			450.00

4. 项目组织管理

（1）相关方职责

高新区财政局：主要负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管；指导业务主管部门加强资金监管和绩效管理。

高新区经济发展局（以下简称“高新区经发局”）：该项目审批部门，主要负责全区项目谋划和管理工作；负责项目的备案、审批、核准及项目库建设工作。

高新区自然资源规划建设局（以下简称“高新区自规建局”）：该项目主管部门，负责对项目开展情况、实施过程、资金使用情况、绩效管理情况等全过程进行监督和指导，督促项目实施单位按计划 and 实施方案要求完成项目建设内容，签订项目相关合同，对项目进行验收等工作。

关堤乡人民政府：该项目建设单位，负责项目具体实施，精准识别道路建设需求；负责项目资金使用管理工作并按规定及时审核报账资料的真实性和合法性；负责项目的论证、

实施等工作；负责项目的前期准备及日常监督检查、竣工验收等工作；督促项目实施单位按计划 and 实施方案要求完成项目建设内容。

重庆长科工程设计有限公司：该项目设计单位，承担施工图设计、工程量计算以及后续服务等工作。

河南聚兴项目管理有限公司：该项目招标代理机构，受关堤乡人民政府委托负责组织实施招投标工作，编制项目招标文件，采购活动资料报送备案及保存管理等工作。

河南苏武建筑工程有限公司：该项目施工单位，按照所签署合同履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受项目主管部门监督约束等。

河南元叁建设咨询有限公司：该项目监理单位，按照所签署监理合同负责项目实施过程中的监管及竣工验收工作；和建设单位沟通施工进度，和主管部门沟通需求等促进项目顺利进行。

（2）项目管理情况

本项目由关堤乡人民政府提出项目立项申请，并负责全面做好项目初期规划，经项目审批部门通过后开始实施。项目单位通过招标代理机构公开招标确定施工单位，由河南苏武建筑工程有限公司进行施工建设，河南元叁建设咨询有限公司在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行监督，对合同、相关资料信息进行管理。

5.利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

- (1) 项目拨款单位：高新区财政局；
- (2) 项目审批单位：高新区经发局；
- (3) 项目主管部门：高新区自规建局；
- (4) 项目建设单位：关堤乡人民政府；
- (5) 项目设计单位：重庆长科工程设计有限公司；
- (6) 项目施工单位：河南苏武建筑工程有限公司；
- (7) 项目监理单位：河南元叁建设咨询有限公司；
- (8) 项目受益方：项目实施区域内各行政村村民。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

在该项目原有道路建设基础上进行整体提升改造，强化基础，增加路沿石、铺设沥青路面，项目建成后，将切实改善村民出行条件，同时对完善区域路网结构，提升道路通行能力，拓展城市发展空间，促进区域经济发展都具有重要意义。

2. 年度绩效目标

评价组根据项目主管部门提供的项目绩效目标表，结合项目资金安排情况进行了汇总梳理，梳理后的项目具体绩效目标如下表 1-2 所示。

表 1-2 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤700.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造提升里程	≥6.80 公里
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	改善村民出行条件	明显改善
		提升路面使用功能	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过本次重点项目支出绩效评价，全面掌握该项目具体实施过程以及预期效益的实现程度，全面、客观地评价项目立项决策、预算执行、实施过程、项目产出和项目效益，发现项目实施过程中存在的问题，并深入剖析原因，不断改进和加强财政支出项目管理，同时为以后年度同类项目预算编制、优化财政支出结构提供参考。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为关堤乡青年路（Y001 乡道）改造提升工程项目，涉及资金规模为 700.00 万元。评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

3.评价时间范围

本次绩效评价时间范围截至 2024 年 12 月。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次绩效评价依据包括但不限于以下文件：

1. 预算绩效管理类

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（4）《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

（5）《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）；

（6）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（7）《新乡市财政局关于印发<新乡市财政绩效评价指南>的通知》（新财效〔2022〕4号）。

2. 业务管理类

（1）《中华人民共和国建筑法》；

- (2) 《建设工程质量管理条例》；
- (3) 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5号）；
- (4) 《河南省市政基础设施工程质量监督管理试行办法》（河南省人民政府令第188号）；
- (5) 《新乡高新区管委会关于印发新乡高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（新开〔2021〕91号）；
- (6) 《关堤乡青年路（Y001乡道）改造提升工程工程可行性研究报告》。

3. 其他类

- (1) 财政部门的预算批复、项目执行的财务及业务资料等；
- (2) 项目招投标文件、合同协议书、施工过程资料、验收报告、反映项目产出及效果的佐证材料等；
- (3) 项目绩效目标申报表、监控表及监控报告、自评表及自评报告；
- (4) 评价组通过访谈和实地调查核实获取的资料。

（三）评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）文件要求，本次评价指标体系从项目设立的背景和目的出发，按照“决策-过程-产

出-效益”的逻辑路径分层设定，结合该项目实际情况，确定绩效评价指标体系框架，设置4个一级指标，13个二级指标和25个三级指标。具体指标体系框架构成如下表2-1所示。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	
A 决策 (15分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 立项依据充分性	3.00	
			A1.2 立项程序规范性	3.00	
	A2 绩效目标	5.00	A2.1 绩效目标合理性	2.00	
			A2.2 绩效指标明确性	3.00	
	A3 资金投入	4.00	A3.1 预算编制科学性	4.00	
B 过程 (25分)	B1 资金管理	6.00	B1.1 资金到位率	2.00	
			B1.2 资金使用合规性	2.00	
			B1.3 预算执行率	2.00	
	B2 业务管理	10.00	B2.1 管理制度健全性	2.00	
			B2.2 制度执行有效性	2.00	
			B2.3 项目库建设及管理规范性	4.00	
			B2.4 绩效管理规范性	2.00	
	B3 项目管理	9.00	B3.1 政府采购规范性	3.00	
			B3.2 合同管理规范性	4.00	
			B3.3 项目验收规范性	2.00	
	C 产出 (30分)	C1 产出数量	6.00	C1.1 项目建设完成率	6.00
		C2 产出质量	10.00	C2.1 项目验收合格率	5.00
C2.2 验收质量达标率				5.00	
C3 产出时效		10.00	C3.1 项目完成及时性	5.00	
			C3.2 资金支付及时性	5.00	

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
	C4 产出成本	4.00	C4.1 项目成本控制有效性	4.00
D 效益 (30分)	D1 社会效益	14.00	D1.1 提升路面使用功能	7.00
			D1.2 改善村民出行条件	7.00
	D2 可持续影响	6.00	D2.1 长效管理机制健全性	6.00
	D3 满意度	10.00	D3.1 村民满意度	10.00
	合计	100.00	-	100.00

1. 决策类指标：占权重为 15 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入 3 个方面进行考察。其中项目立项主要考察立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标主要考察绩效目标合理性、绩效指标明确性；资金投入主要考察预算编制科学性。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2. 过程类指标：占权重为 25 分，主要从资金管理、业务管理、项目管理 3 个方面进行考察。其中资金管理主要考察资金到位率、资金使用合规性、预算执行率；业务管理主要考察管理制度健全性、制度执行有效性、项目库建设及管理规范性、绩效管理规范性；项目管理主要考察政府采购规范性、合同管理规范性、项目验收规范性。包括 3 个二级指标，10 个三级指标。

3. 产出类指标：占权重为 30 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面进行考察。其中产出数量主要考察项目建设完成率；产出质量主要考察项目验收合格率、验收质量达标率；产出时效主要考察项目完成及时性、

资金支付及时性；产出成本主要考察项目成本控制有效性。
包括 4 个二级指标，6 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 30 分，主要从社会效益、可持续影响、满意度 3 个方面进行考察。其中社会效益主要考察提升路面使用功能、改善村民出行条件；可持续影响主要考察长效管理机制健全性；满意度主要考察村民满意度。包括 3 个二级指标，4 个三级指标。

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分 90（含）—100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（四）绩效评价原则、方法和标准

1.评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析该项目的立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合评价项目实施效果及资金支出的效益。

2.评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定性相结合的评价方式，主要采用以下方法：

（1）比较法

评价组通过对项目整体规划目标与实施效果、历史与当期等情况比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入是否科学、建设内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

（2）因素分析法

评价组在通过多种方式充分了解项目建设情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，查阅项目决策、实施、管理等过程记录文件，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

（3）综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目实施成效进行综合、全面的评价。

（4）公众评判法

评价组针对项目实施过程、监督管理情况、投入使用情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解项目主管部门和项目受益对象对项目整体完成情况的满意程度和相关意见、建议，分析项目实施、管理是否符合受益对象的现实需求。

（5）社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目实施完成情况及绩效目标的实现程度进行调

查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

(6) 其他评价方法

评价组根据上述评价工作的进展情况，视工作需要而采取的其他方法。

3.评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价分为四个阶段，分别为前期准备、方案制定、评价实施、成果出具，工作期间为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 20 日，将于 2024 年 12 月 20 日前完成报告终稿提交区财政局，各阶段工作内容及时间安排如下表 2-2 所示。

表 2-2 绩效评价工作内容及时间安排

阶段	时间	工作内容
前期	10 月 14 日	组建绩效评价工作组：根据评价项目情况成立

阶段	时间	工作内容
准备		绩效评价组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。
	10月14日	对接财政局： 评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位： 评价组对接项目实施单位负责人，下发绩效评价资料清单。
	10月15日—10月16日	了解项目政策背景： 评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	10月17日—10月22日	初步收集资料： 评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
	10月23日—10月27日	开展前期调研： 评价组对收集到的项目资料进行汇总、分析和整理，在与项目单位沟通访谈的基础上，充分了解项目的背景、绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理等，为制定切实可行的评价指标体系奠定基础。
方案制定	10月28日—11月6日	编制绩效评价工作方案： 评价组根据前期调研情况及收集到的资料，对项目资料进行梳理分析，运用科学的指标设计原则，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	11月7日—11月10日	评价工作方案征求意见： 评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系

阶段	时间	工作内容
		等进行适当修改、完善。
评价实施	11月11日—11月13日	补充资料收集: 评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况, 视现有资料提交情况, 对项目实施后期资料进行补充收集。
	11月14日—11月30日	现场调研及访谈: 主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。根据项目特点, 评价组选取不同的方式进行现场调研, 收集评价所需基础数据, 并对不同关联方进行访谈。 问卷调研: 评价组按照评价工作方案, 针对项目指标, 开展问卷调查, 并对回收的问卷进行整理分析, 得出调查结论。
成果出具	12月1日—12月12日	出具评价报告初稿: 在现场调研的基础上, 评价组依据规定的报告文本格式和内容撰写评价报告, 经三级复核后, 形成评价报告初稿。
	12月13日—12月18日	评价报告初稿征求意见: 评价组向区财政局、项目实施单位报送评价报告初稿, 征求相关方意见, 修改后形成评价报告正式稿。
	12月20日之前	报送正式评价报告: 评价组根据评价工作要求向区财政局报送并装订正式绩效评价报告。 资料归档: 评价组在本次评价工作结束后, 分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

总体来看, 该项目立项依据充分, 立项程序规范; 项目

资金管理层面，预算编制科学合理，资金使用过程合规；过程管理方面，招投标手续齐全，合同管理基本规范；产出层面，项目整体完成度较高，已正常投入使用；效益方面，完善了区域交通环境，进一步满足居民日常出行需求，整体满意度达到 99.42%。该项目的建设将切实改善村民出行条件，同时对完善区域路网结构，提升道路通行能力，拓展城市发展空间，促进高新区经济发展都具有重要意义。

但是从评价组调研情况来看，项目还存在绩效管理工作不够规范、资金支付进度较为缓慢、项目后续管护制度不到位等问题。

（二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 89.08 分，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。具体得分情况如下表 3-1 所示。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 决策	15.00	14.00	93.33%
B 过程	25.00	22.21	88.84%
C 产出	30.00	28.87	96.23%
D 效益	30.00	24.00	80.00%

一级指标	权重分	得分	得分率
合计	100.00	89.08	89.08%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标共 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 14.00 分，得分率 93.33%。三级指标得分情况如下表 4-1 所示。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	6.00	6.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	3.00	3.00	00.00%
A2 绩效目标	5.00	4.00	80.00%
A2.1 绩效目标合理性	2.00	2.00	00.00%
A2.2 绩效指标明确性	3.00	2.00	66.67%
A3 资金投入	4.00	4.00	100.00%
A3.1 预算编制科学性	4.00	4.00	00.00%
合计	15.00	14.00	93.33%

A1.1 立项依据充分性：①根据《新乡高新区管委会关于印发新乡高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（新开〔2021〕91号）文件要求，项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，要素①得满分；②根据《新乡市城市总体规划》文件要求，项目符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③

该项目立项属于高新区自规建局“负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理”等部门职责范围，要素③得满分；④该项目具有公共服务性质，属于财政支持范畴，要素④得满分；⑤该项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A1.2 立项程序规范性：通过核查项目单位提供的资料：
①该项目由关堤乡人民政府组织建设，并有效提供了可行性研究报告及请示文件等，2023 年 5 月 18 日，高新区经发局作出《关于关堤乡青年路（Y001 乡道）改造提升工程可行性研究报告的批复》（新开经〔2023〕68 号），同意该项目实施建设，项目按照规定的程序申请设立，要素①得满分；
②该项目申请、审批程序文件、材料符合相关要求，要素②得满分；
③项目实施前已开展可行性研究、事前评估、专家论证、风险评估等工作，要素③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A2.1 绩效目标合理性：根据项目单位提供的绩效目标表及项目相关资料：①项目单位按照预算绩效管理要求填报了项目绩效目标表，内容基本完整全面，要素①得满分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，要素②得满分；③项目整体预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，要素③得满分；④项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，要素④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A2.2 绩效指标明确性：通过核查项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，包括经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，要素①得满分；②项目产出时效中年度指值标设置为“按合同要求完成既定工作≥100%”，无法准确衡量项目实际开展或完成时间，要素②不得分；③已填报的项目绩效目标表与项目目标任务数相对应，要素③得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A3.1 预算编制科学性：通过核查项目单位资料，结合评价组访谈调研结果：①项目按照工程费用、工程建设其他费用、预备费等分类编制预算，各单项工程按照计划实施内容及综合单价测算得出，测算过程清晰，要素①得满分；②该项目预算编制过程具有科学性，要素②得满分；③项目预算内容和项目实际实施内容相匹配，要素③得满分；④根据项目实施内容，项目预算确定的资金量与项目工作内容相匹配，要素④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

（二）项目过程情况

过程指标共 3 个二级指标，10 个三级指标，权重分值共 25.00 分，实际得分 22.21 分，得分率 88.84%。三级指标得分情况如下表 4-2 所示。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	6.00	5.21	86.83%

指标	权重	得分	得分率
B1.1 资金到位率	2.00	1.66	83.00%
B1.2 资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
B1.3 预算执行率	2.00	1.55	77.50%
B2 业务管理	10.00	8.00	80.00%
B2.1 管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
B2.2 制度执行有效性	2.00	2.00	100.00%
B2.3 项目库建设及管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B2.4 绩效管理规范性	2.00	0.00	0.00%
B3 项目管理	9.00	9.00	100.00%
B3.1 政府采购规范性	3.00	3.00	100.00%
B3.2 合同管理规范性	4.00	4.00	100.00%
B3.3 项目验收规范性	2.00	2.00	100.00%
合计	25.00	22.21	88.84%

B1.1 资金到位率：通过核查项目单位提供的资金申请及批复相关资料：该项目计划总投资为 700.00 万元，预算批复金额为 700.00 万元，最终工程竣工决算审计核定工程价为 580.69 万元，实际到位资金 580.69 万元，资金到位率= $(580.69/700.00) \times 100\%=82.96\%$ 。根据评分规则，得 82.96% 权重分，本项指标得 1.66 分。

B1.2 资金使用合规性：通过核查项目单位提供的国库集中支付凭证及明细账等财务资料：①项目资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度，要素①得满分；②项目资金的报账审批表具备项目主管部门及高新区财政局的审核与批复，具有完整的审批程序和手续，要素②得满分；③资金的支付

符合项目预算批复及合同规定的用途，要素③得满分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要素④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B1.3 预算执行率：通过核查项目单位提供的国库集中支付凭证及明细账等财务资料：该项目实际到位资金为 580.69 万元，实际支出资金为 450.00 万元，预算执行率 = $(450.00/580.69) \times 100\% = 77.49\%$ 。根据评分规则，得 77.49% 权重分，本项指标得 1.55 分。

B2.1 管理制度健全性：①项目单位已制定《财务报账管理办法》、《采购与付款内部控制制度》、《固定资产管理暂行办法》、《岗位责任制及定期轮岗制度》、《合同管理内部控制制度》等财务和业务管理制度，要素①得满分；②已制定的管理制度合法、合规，内容完整，要素②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.2 制度执行有效性：通过核查项目单位提供的各项实施过程资料：①项目实施严格按照《施工组织设计（方案）》执行，遵守相关法律法规和相关管理制度的规定，要素①得满分；②该项目实施与原合同计划无变动，未涉及变更，要素②得满分；③该项目招投标文件、合同书、施工日志、监理日志、验收报告及报账材料各环节资料齐全并已归档，要素③得满分；④该项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位，要素④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.3 项目库建设及管理规范性：①项目单位 2023 年建立有项目库管理，要素①得满分；②项目入库程序规范，要素②得满分；③项目入库前期条件成熟，具备实施条件，要素③得满分；④项目入库内容包括项目名称、项目类型、建设性质、实施地点、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、绩效目标等，内容完整，要素④得满分；⑤入库项目范围合理，不存在负面清单，要素⑤得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.4 绩效管理规范性：通过查看项目单位提供的绩效管理资料：①项目绩效监控表内容填写基本完整，但质量指标中“验收合格率”的 1-6 月执行情况填写为“≥100%”，根据评价组核查项目完工资料，该项目于 2023 年 8 月 15 日申请竣工验收，截至绩效监控节点，按照实际进度，“验收合格率”应填写为“0%”，要素①不得分；②项目绩效自评表内容填报基本完整、客观，但绩效自评报告内容、格式过于简单，未逐项分析各项指标的得分情况和项目整体完成情况，要素②不得分。综上，本项指标得 0.00 分。

B3.1 政府采购规范性：通过核查项目单位提供的招投标资料：①关堤乡人民政府委托河南聚兴项目管理有限公司采取公开招标的方式对项目施工过程中组织招标活动，要素①得满分；②采购前有实施计划及备案表，采购程序规范，符合政府采购管理或部门采购管理相关流程，要素②得满分；③该项目招标公告、中标结果等信息均已在新乡市政府采购

网、全国公共资源交易平台上进行公示，要素③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B3.2 合同管理规范性：通过核查项目单位提供的合同资料：①项目建设单位与施工单位签订有正规合同，要素①得满分；②已签订的合同、协议书要素基本齐全，对采购需求、服务范围、开工时间、竣工时间、工程款支付节点等重要内容进行了说明，要素②得满分；③项目建设单位与中标单位均在规定期限内签订项目合同书，合同签订及时，要素③得满分；④项目实际建设情况按照合同规定要素执行，要素④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B3.3 项目验收规范性：通过核查项目单位提供的竣工验收资料：①涉及定位测量、道路路基工程、混凝土工程、管道铺设、路缘石工程、沥青混凝土共 6 项分部工程均进行报验申请，验收记录为“合格”，要素①得满分；②项目由施工单位完工后提出验收申请，关堤乡人民政府组织施工单位、设计单位、监理单位等共同进行项目验收，并提供了《建设工程竣工验收报告》，整体验收质量合格，验收流程规范，验收资料齐全，要素②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

(三) 项目产出情况

产出指标共 4 个二级指标，6 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 28.87 分，得分率 96.23%。三级指标得分情况如下表 4-3 所示。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	6.00	6.00	100.00%
C1.1 项目建设完成率	6.00	6.00	100.00%
C2 产出质量	10.00	10.00	100.00%
C2.1 项目验收合格率	5.00	5.00	100.00%
C2.2 验收质量达标率	5.00	5.00	100.00%
C3 产出时效	10.00	8.87	88.70%
C3.1 项目完成及时性	5.00	5.00	100.00%
C3.2 资金支付及时性	5.00	3.87	77.40%
C4 产出成本	4.00	4.00	100.00%
C4.1 项目成本控制有效性	4.00	4.00	100.00%
合计	30.00	28.87	96.23%

C1.1 项目建设完成率：通过核查项目单位提供的项目资料及实地调研情况：该项目已于2023年8月15日完工并进行验收，项目建设完成率为100%。综上，本项指标得6.00分。

C2.1 项目验收合格率：通过核查项目单位资料，结合评价组实地调研结果：该项目共涉及定位测量、道路路基工程、混凝土工程、管道铺设、路缘石工程、沥青混凝土等6项建设内容，根据分项质量验收记录，经查6项分部工程均符合标准及设计要求，验收结论为“合格”，项目验收合格率为100.00%。根据评分规则，得100%权重分，本项指标得5.00分。

C2.2 验收质量达标率：通过核查项目单位资料，结合评

价组实地调研结果：该项目整体建设效果较好，路面宽阔平整，地面标识线清晰，未出现质量问题，验收质量达标率为100.00%。根据评分规则，得100%权重分，本项指标得5.00分。

C3.1 项目完成及时性：通过核查项目单位资料，结合评价组访谈调研结果：①该项目计划于2023年7月5日开工，施工日记中记录“2023年7月5日，施工机械设备进场，人员进场”，实际开工时间按照合同计划进行，要素①得满分；②该项目计划于2023年12月27日竣工，实际竣工日期为2023年8月15日，应建设单位要求提前完成施工任务，要素②得满分；③项目原计划建设工期为180天，实际建设周期为2023年7月5日至2023年8月15日，共计40天完工，针对工期缩短的原因，关堤乡人民政府出具了情况说明，未超过工期要求，并提前恢复道路通行，要素③得满分。综上，本项指标得5.00分。

C3.2 资金支付及时性：通过核查项目单位资料，结合评价组访谈调研结果：根据《建设工程施工合同》约定，项目工程款应在工程竣工验收合格后，支付至已完工程造价金额（不含证、变更）的80%；工程结算审计完成后支付至结算价款的97%，剩余结算价款在缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。截至2024年12月，共计拨付工程款450.00万元，资金拨付进度= $(450.00/580.69) \times 100\% = 77.49\%$ ，未达到资金支付要求。根据评分规则，资金未支付完毕，按照

支付比例得 77.49%权重分，本项指标得 3.87 分。

C4.1 项目成本控制有效性：通过核查项目单位资料，结合评价组访谈调研结果：该项目计划总投资为 700.00 万元，工程竣工决算审计核定工程价为 580.69 万元，最终预算批复金额为 580.69 万元，未超出财政预算安排。根据评分规则，得 100%权重分，综上，本项指标得 4.00 分。

（四）项目效益情况

效益指标共 3 个二级指标，4 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 24.00 分，得分率 80.00%。三级指标得分情况如下表 4-4 所示。

表 4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	14.00	14.00	100.00%
D1.1 提升路面使用功能	7.00	7.00	100.00%
D1.2 改善村民出行条件	7.00	7.00	100.00%
D2 可持续影响	6.00	0.00	0.00%
D2.1 长效管理机制健全性	6.00	0.00	0.00%
D3 满意度	10.00	10.00	100.00%
D3.1 村民满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	30.00	24.00	80.00%

D1.1 提升路面使用功能：通过核查项目单位资料，结合评价组实地调研结果：①该项目原有道路坑洼不平，多处出现路面裂缝、错台等情况，现经改造提升后，路面宽阔平整，道路两旁绿化覆盖率较高，整体完工效果较好；②地面设有

明显标线，区域划分明确，双向两车道畅通无阻，保障了附近村民出行安全。综上，本项指标得 7.00 分。

D1.2 改善村民出行条件：通过核查项目单位资料，结合评价组实地调研结果：①该项目实施改造前的路况严重影响周边群众的出行安全，现经改造提升后，路面宽阔平整，地面标线清晰，道路两旁绿化覆盖率较高，靠近河堤处均有安装防护网与防护栏，满足日常出行需求；②道路两旁与分岔路口处均设有安全警示牌与路线指示牌等，地面设有明显标线，车道区域划分明确，基础设施建设完善。综上，本项指标得 7.00 分。

D2.1 长效管理机制健全性：项目单位对道路后续管护工作不到位，未提供长效管理方面资料，根据评分规则，扣除 100%权重分，本项指标得 0.00 分。

D3.1 村民满意度：针对该项目的实施效果与投入使用情况，评价组对区域内村民进行问卷调查，共收回有效问卷 181 份，经统计周边村民对该项目的综合满意度达 99.42%，满意程度较高。依据评分规则，本项指标得分 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

1.严格把控原材料质量

项目单位在施工过程中严格控制原材料质量，保证工程所用材料全部合格，强化过程检测和各工序质量控制，在材料、设备采购前对材料、设备供应单位进行资质审查，选择

有质量保证能力的材料、设备供应单位。工程所用的各种材料、配件和设备，具有出厂合格证、质量品质证明书以及材质报告，检验合格的材料方可用于施工现场。

2.改善辖区居民生活环境

该项目原有路段由于年久失修，部分路面已坑洼不平，多处出现路面裂缝、错台等，严重影响周边群众的出行安全。项目建成后效果对比明显，整体完成情况较好，不仅满足居民日常出行需求，同时对完善区域路网结构，提升道路通行能力，拓展城市发展空间，促进高新区经济发展都具有重要意义。

(二) 存在的主要问题

1.绩效管理工作不够规范

一是项目产出时效中年度指值标设置为“按合同要求完成既定工作 $\geq 100\%$ ”，无法准确衡量项目实际开展或完成时间。二是绩效监控表中质量指标“验收合格率”的1-6月执行情况填写为“ $\geq 100\%$ ”，根据评价组核查项目完工资料，该项目于2023年8月15日申请竣工验收，截至绩效监控节点，按照实际进度，“验收合格率”应填写为“0%”。三是绩效自评报告内容、格式过于简单，未逐项分析各项指标的得分情况和项目整体完成情况。主要是由于预算单位对预算绩效管理认识不够透彻，对绩效管理填报规范和要求理解不到位，在内容填报方面有待进一步加强。

2.资金支付进度较为缓慢

按照合同计划应在工程竣工验收合格后，支付至已完工程造价金额（不含证、变更）的 80%；工程结算审计完成后支付至结算价款的 97%，剩余结算价款在缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。截至 2024 年 12 月，该项目共计支付四笔工程款 450.00 万元，预算执行率为 77.49%，未达到合同要求比例。主要是由于该项目资金来源为上级补助资金和本级财政资金两部分，在资金支付方面按照项目实际情况进行。

3.项目后续管护制度不到位

项目单位对于道路后续管理维护等工作做的不到位，未提供道路相关后续维护制度及计划、管护记录、巡查台账等资料，未根据项目实际情况制定管护制度，落实管护责任，不利于项目后期长效高质管理与维护。项目单位相关管理制度不够健全，未认识到建立行之有效的管理机制的重要性，日常监督管理力度有待加强。

六、有关建议

（一）根据项目实际情况填报绩效

建议单位强化绩效管理意识，在项目立项前期设置绩效指标要清晰、细化、可衡量，按照项目实际用途进行设置，目标要能够完整反映项目的预期产出和效果，加以保障项目实施进度，例如：一是“产出时效”中的三级指标可以设置为“项目竣工时间”、“资金支付节点”等，指标值设置为可衡量的具体时间或周期；二是在年中开展绩效监控工作

时，按照实际项目开展情况与进度填报绩效监控表、监控报告，合理填报绩效目标实现程度；三是在年底开展绩效自评工作时，要全面、透彻的分析项目实施进度与完成情况，逐项分析绩效目标实现和未实现的原因，对项目整体进行全方位的自我评价，加以保障项目顺利实施。

（二）切实保障资金支付进度

为使项目资金尽快拨付到位，可根据项目实际进度，提前谋划，建立资金支出计划，确保资金支付手续以及资金审批资料、流程顺利进行，并采取多项措施切实加快资金支付进度，提高资金使用效益。若出现资金支付进度缓慢的情况，建议及时与相关部门配合、沟通商议资金筹措手段，保障项目进度与资金支付进度均按计划进行。

（三）加强项目后续监督管理

项目单位与其他相关部门之间要加强沟通，承担起各个部门的管理责任，根据项目实施方案落实各个环节运行与管理的监督机制，加强日常监督管理和维护，落实管护人员责任，建立巡查台账，定期巡查道路使用情况，延长道路使用年限。

七、其他需要说明的问题

（一）本报告基础资料由高新区自规建局、关堤乡人民政府提供并对其真实性、合法性、完整性负责。

（二）本次评价工作是在评价组和项目实施单位的配合下完成的，评价组具体实施评价工作和撰写评价报告并保证

本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请评价报告使用者予以关注。

八、附件

附件 1: 评价指标体系及评分表

附件 2: 满意度调查问卷

附件 3: 满意度调查分析报告

附件 1：评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
A 决策(15分)	A1 项目立项(6分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原	五项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的20%。	①根据《新乡高新区管委会关于印发新乡高新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（新开〔2021〕91号）文件要求，项目立项符合国家相关法律法规、国民经济发展规划，要素①得满分；②根据《新乡市城市总体规划》文件要求，项目符合行业发展规划和政策要求，要素②得满分；③该项目立项属于高新区自规建局“负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		理、城市基础设施建设管理”等部门职责范围，要素③得满分；④该项目具有公共服务性质，属于财政支持范畴，要素④得满分；⑤该项目不存在相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，要素⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		A1.2 立项程序规范性	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②项目审批文件、材料是否符合相关要求；③项目事前是否已经过必要的可行性	三项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	通过核查项目单位提供的资料：①该项目由关堤乡人民政府组织建设，并有效提供了可行性研究报告及请示文件等，2023 年 5 月 18 日，高新区经发局作出《关于关堤乡青年路（Y001 乡道）	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。		改造提升工程可行性研究报告的批复》（新开经〔2023〕68号），同意该项目实施建设，项目按照规定的程序申请设立，要素①得满分；②该项目申请、审批程序文件、材料符合相关要求，要素②得满分；③项目实施前已开展可行性研究、事前评估、专家论证、风险评估等工作，要素③得满分。综上，本项指标得3.00分。	
	A2 绩效目标（5	A2.1 绩效目标	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否	合理	评价要点：①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目	四项都符合得100%权重分，有	根据项目单位提供的绩效目标表及项目相关资料：①项目单位按照预算绩效管理要求填报了	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	分)	合理性		符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	一项不符合扣权重分的 25%。	项目绩效目标表,内容基本完整全面,要素①得满分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,要素②得满分; ③项目整体预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,要素③得满分; ④项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配,要素④得满分。综上,本项指标得 2.00 分。	
		A2.2 绩效 指标 明确 性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考	明确	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以	三项都符合得 100% 权重分,有一项不符合扣权重	通过核查项目单位提供的项目绩效目标表: ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,包括经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
				核项目绩效目标的明细化情况。		体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	分的 1/3。	服务对象满意度指标等，要素①得满分；②项目产出时效中年度指值标设置为“按合同要求完成既定工作≥100%”，无法准确衡量项目实际开展或完成时间，要素②不得分；③已填报的项目绩效目标表与项目目标任务数相对应，要素③得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A3 资金投入（4分）	A3.1 预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否	科学	评价要点：①项目预算编制是否有清晰的测算过程；②预算编制是否经过科学论证；③预算内容与项	四项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重	通过核查项目单位资料，结合评价组访谈调研结果：①项目按照工程费用、工程建设其他费用、预备费等分类编制预算，各单项工程按照计划实施内容及综合	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
				相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		目内容是否匹配; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	分的 25%。	单价测算得出, 测算过程清晰, 要素①得满分; ②该项目预算编制过程具有科学性, 要素②得满分; ③项目预算内容和项目实际实施内容相匹配, 要素③得满分; ④根据项目实施内容, 项目预算确定的资金量与项目工作内容相匹配, 要素④得满分。综上所述, 本项指标得 4.00 分。	
B 过程(25分)	B1 资金管理(6分)	B1.1 资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目	100%	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 ①实际到位资金: 一定时期(本年度或项	与计划资金量一致得 100%权重分, 否则按实际完	通过核查项目单位提供的资金申请及批复相关资料: 该项目计划总投资为 700.00 万元, 预算批复金额为 700.00 万元, 最终工程竣工决算审计核定工程价	1.66

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
				实施的总体保障程度。		日期)内落实到具体项目的资金;②预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	成金额的比例得相应权重分。	为580.69万元,实际到位资金580.69万元,资金到位率= $(580.69/700.00) \times 100\%=82.96\%$ 。根据评分规则,得82.96%权重分,本项指标得1.66分。	
		B1.2 资金使用 合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合	四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的25%。若缺少要素③或④	通过核查项目单位提供的国库集中支付凭证及明细账等财务资料:①项目资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度,要素①得满分;②项目资金的报账审批表具备项目主管部门及高新区财政局的审核与批复,具有完整的审批程序和手续,要素②得	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	的情况,该项指标不得分。	满分;③资金的支付符合项目预算批复及合同规定的用途,要素③得满分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,要素④得满分。综上,本项指标得 2.00 分。	
		B1.3 预算 执行 率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。①实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金; ②实际到位资金: 一定	与计划资金量一致得 100%权重分,否则按实际完成金额的比例得相应权重分。	通过核查项目单位提供的国库集中支付凭证及明细账等财务资料: 该项目实际到位资金为 580.69 万元, 实际支出资金为 450.00 万元, 预算执行率= (450.00/580.69) × 100%=77.49%。根据评分规则, 得 77.49%权重分, 本项指标得	1.55

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。		1.55分。	
	B2 业务管理(10分)	B2.1 管理制度健全性	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	①项目单位已制定《财务报账管理办法》、《采购与付款内部控制制度》、《固定资产管理暂行办法》、《岗位责任制及定期轮岗制度》、《合同管理内部控制制度》等财务和业务管理制度,要素①得满分;②已制定的管理制度合法、合规,内容完整,要素②得满分。综上,本项指标得2.00分。	2.00
		B2.2	2.00	项目实施是否	有效	评价要点: ①是否遵	四项都符	通过核查项目单位提供的各项	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
		制度执行有效性		符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及变更手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、施工日志、监理日志、技术鉴定、报账材料等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	合得 100% 权重分,有一项不符合扣权重分的 25%。	实施过程资料: ①项目实施严格按照《施工组织设计(方案)》执行,遵守相关法律法规和相关管理制度的规定,要素①得满分; ②该项目实施与原合同计划无变动,未涉及变更,要素②得满分; ③该项目招投标文件、合同书、施工日志、监理日志、验收报告及报账材料各环节资料齐全并已归档,要素③得满分; ④该项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位,要素④得满分。综上,本项指标得 2.00 分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
		B2.3 项目库建设及管理规范性	4.00	考察项目库建设是否按照有关规定进行,项目库建设是否完整、规范。	规范	评价要点: ①是否建立项目库; ②项目入库程序是否规范; ③项目入库前期条件是否成熟, 具备实施条件; ④入库项目内容是否完整。应包括项目名称、项目类型、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标等; ⑤入库项目范围是否合	五项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的20%。	①项目单位2023年建立有项目库管理,要素①得满分; ②项目入库程序规范,要素②得满分; ③项目入库前期条件成熟,具备实施条件,要素③得满分; ④项目入库内容包括项目名称、项目类型、建设性质、实施地点、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、绩效目标等,内容完整,要素④得满分; ⑤入库项目范围合理,不存在负面清单,要素⑤得满分。综上,本项指标得4.00分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						理，不存在负面清单项目。			
		B2.4 绩效管理 规范性	2.00	考察项目实施单位是否按照绩效管理要求填报绩效监控与绩效自评内容。	规范	评价要点：①是否完整、客观的填报项目绩效监控表、监控报告；②是否完整、客观的填报项目绩效自评表、项目绩效自评报告。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	通过查看项目单位提供的绩效管理资料：①项目绩效监控表内容填写基本完整，但质量指标中“验收合格率”的1-6月执行情况填写为“≥100%”，根据评价组核查项目完工资料，该项目于2023年8月15日申请竣工验收，截至绩效监控节点，按照实际进度，“验收合格率”应填写为“0%”，要素①不得分；②项目绩效自评表内容填报基本完整、客观，但绩效自评报告内	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								容、格式过于简单，未逐项分析各项指标的得分情况和项目整体完成情况，要素②不得分。综上，本项指标得 0.00 分。	
	B3 项目管理 (9 分)	B3.1 政府采购规范性	3.00	考察政府采购程序是否符合政府相关规定，是否严格、规范的执行招投标程序。	规范	评价要点：①采购活动是否按照政府采购相关标准采用合适的采购方式；②实施程序是否规范，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关流程的规定；③是否按照规定进行公示公开。	三项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	通过核查项目单位提供的招投标资料：①关堤乡人民政府委托河南聚兴项目管理有限公司采取公开招标的方式对项目施工过程中组织招标活动，要素①得满分；②采购前有实施计划及备案表，采购程序规范，符合政府采购管理或部门采购管理相关流程，要素②得满分；③该项目招投标公告、中标结果等信息均已	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								在新乡市政府采购网、全国公共资源交易平台上进行公示,要素③得满分。综上,本项指标得3.00分。	
		B3.2 合同管理规范性	4.00	考察合同管理是否有效实施,是否按照采购要求订立相关合同,签订的合同是否要素齐全、约定明确,执行有效。	规范	评价要点:①是否按照采购要求订立合同(含延续合同、变更合同);②合同要素是否齐全,内容明确,表述清晰;③合同是否签订及时;④是否按合同规定要素执行。	四项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的25%。	通过核查项目单位提供的合同资料:①项目建设单位与施工单位签订有正规合同,要素①得满分;②已签订的合同、协议书要素基本齐全,对采购需求、服务范围、开工时间、竣工时间、工程款支付节点等重要内容进行了说明,要素②得满分;③项目建设单位与中标单位均在规定期限内签订项目合同书,合同签	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								订及时,要素③得满分;④项目实际建设情况按照合同规定要素执行,要素④得满分。综上,本项指标得4.00分。	
		B3.3 项目验收规范性	2.00	考察项目完成后,是否有效开展项目验收活动,验收过程、手续是否规范。	规范	评价要点:①分项工程是否完成验收,流程是否规范;②项目是否完成整体验收,验收资料是否规范齐全。	两项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的50%。	通过核查项目单位提供的竣工验收资料:①涉及定位测量、道路路基工程、混凝土工程、管道铺设、路缘石工程、沥青混凝土共6项分部工程均进行报验申请,验收记录为“合格”,要素①得满分;②项目由施工单位完工后提出验收申请,关堤乡人民政府组织施工单位、设计单位、监理单位等共同进行项目验收,	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
								并提供了《建设工程竣工验收报告》，整体验收质量合格，验收流程规范，验收资料齐全，要素②得满分。综上，本项指标得2.00分。	
C 产出(30分)	C1 产出数量(6分)	C1.1 项目建设完成率	6.00	考察该项目建设完成情况。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%	评价要点：根据总体项目情况进行评分。截至2023年12月31日，所有建设内容均已完工。	与计划任务内容一致得100%权重分，每有一项建设项目未完工，扣权重分的15%，扣完	通过核查项目单位提供的项目资料及实地调研情况：该项目已于2023年8月15日完工并进行验收，项目建设完成率为100%。综上，本项指标得6.00分。	6.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
							为止。		
	C2 产出质量(10分)	C2.1 项目验收合格率	5.00	考察该项目已完成验收合格情况。用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	评价要点：项目验收合格率=(验收合格项目数量/已完成项目总量)×100%。	项目验收合格率达到100%，得满分；低于100%，不得分。	通过核查项目单位资料，结合评价组实地调研结果：该项目共涉及定位测量、道路路基工程、混凝土工程、管道铺设、路缘石工程、沥青混凝土等6项建设内容，根据分项质量验收记录，经查6项分部工程均符合标准及设计要求，验收结论为“合格”，项目验收合格率为100.00%。根据评分规则，得100%权重分，本项指标得5.00分。	5.00
		C2.2 验收	5.00	考察该项目建设质量达标情	100%	评价要点：根据总体验收质量结合评价组	质量达标率达到	通过核查项目单位资料，结合评价组实地调研结果：该项目整体	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
		质量达标率		况。用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		实地调研情况进行评分。	100%，得满分；否则不得分。	建设效果较好，路面宽阔平整，地面标识线清晰，未出现质量问题，验收质量达标率为100.00%。根据评分规则，得100%权重分，本项指标得5.00分。	
	C3产出时效(10分)	C3.1项目完成及时性	5.00	考察该项目是否按照计划有效推进,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	评价要点：①是否按照合同计划开工时间进场施工；②是否按照合同计划竣工时间进行竣工验收工作；③施工工期是否按照合同计划时间进行。	三项都符合得100%权重分,有一项不符合扣权重分的1/3;与计划时间一致得	通过核查项目单位资料,结合评价组访谈调研结果:①该项目计划于2023年7月5日开工,施工日记中记录“2023年7月5日,施工机械设备进场,人员进场”,实际开工时间按照合同计划进行,要素①得满分;②该项目计划于2023年12月27日竣	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
							100%权重分,每推迟一天,扣权重分的15%,扣完为止。	工,实际竣工日期为2023年8月15日,应建设单位要求提前完成施工任务,要素②得满分;③项目原计划建设工期为180天,实际建设周期为2023年7月5日至2023年8月15日,共计40天完工,针对工期缩短的原因,关堤乡人民政府出具了情况说明,未超过工期要求,并提前恢复道路通行,要素③得满分。综上,本项指标得5.00分。	
		C3.2 资金 支付	5.00	考察该项目是否按照合同要求的时间节点	及时	评价要点:该项目资金是否按照合同计划在工程竣工验收合格	按合同计划如期支付项目资	通过核查项目单位资料,结合评价组访谈调研结果:根据《建设工程施工合同》约定,项目工程	3.87

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
		及时性		及时支付工程款,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		后,支付至已完工程造价金额(不含证、变更)的80%;工程结算审计完成后支付至结算价款的97%,剩余结算价款在缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。	金得100%权重分,若资金未支付完毕,按照支付比例得相应权重分。	款应在工程竣工验收合格后,支付至已完工程造价金额(不含证、变更)的80%;工程结算审计完成后支付至结算价款的97%,剩余结算价款在缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清。截至2024年12月,共计拨付工程款450.00万元,资金拨付进度= $(450.00/580.69) \times 100\% = 77.49\%$,未达到资金支付要求。根据评分规则,资金未支付完毕,按照支付比例得77.49%权重分,本项指标得3.87分。	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
	C4 产出成本 (4分)	C4.1 项目成本控制有效性	4.00	考察项目实施过程中,预算单位对于项目成本控制是否有效。	有效	评价要点:项目整体建设成本在财政预算资金范围内,不超出财政预算安排。	不超出财政预算安排得100%权重分,否则不得分。	通过核查项目单位资料,结合评价组访谈调研结果:该项目计划总投资为700.00万元,工程竣工决算审计核定工程价为580.69万元,最终预算批复金额为580.69万元,未超出财政预算安排。根据评分规则,得100%权重分,综上,本项指标得4.00分。	4.00
D 效益 (30分)	D1 社会效益 (14分)	D1.1 提升路面使用功能	7.00	考察项目实施后,是否有效提升路面使用功能。	有效提升	评价要点:①项目实施后是否改造原有道路建设基础条件;②是否保障分道通行,机动车道、非机动车	通过对比道路提升改造前后的情况,两项都符合	通过核查项目单位资料,结合评价组实地调研结果:①该项目原有道路坑洼不平,多处出现路面裂缝、错台等情况,现经改造提升后,路面宽阔平整,道路两旁	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						道、人行道区域划分明确。	得 100%权重分,有一项不符合扣权重分的 50%。	绿化覆盖率较高,整体完工效果较好;②地面设有明显标线,区域划分明确,双向两车道畅通无阻,保障了附近村民出行安全。综上,本项指标得 7.00 分。	
		D1.2 改善 村民 出行 条件	7.00	考察项目实施后,是否明显改善村民出行条件。	明显改善	评价要点:①项目实施后是否满足村民们正常出行条件;②基础设施建设是否健全。	通过对比道路施工前与施工后的通行情况,两项都符合得 100%权重分,有一项不符合扣	通过核查项目单位资料,结合评价组实地调研结果:①该项目实施改造前的路况严重影响周边群众的出行安全,现经改造提升后,路面宽阔平整,地面标线清晰,道路两旁绿化覆盖率较高,靠近河堤处均有安装防护网与防护栏,满足日常出行需求;②道路两旁与分岔路口处均设有	7.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
							权重分的50%。	安全警示牌与路线指示牌等，地面设有明显标线，车道区域划分明确，基础设施建设完善。综上，本项指标得7.00分。	
	D2 可持续影响（6分）	D2.1 长效管理机制健全性	6.00	考察项目后续道路管理机制实际实施情况和执行情况。	健全	评价要点：①是否已制定或具有切实可行的道路管理维护制度或计划；②管护制度是否有明确的分工，各项内容是否有明确的责任人，管护人员是否落实到位；③是否根据管护制度或计划开展管护工作，管	三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的1/3。	项目单位对道路后续管护工作不到位，未提供长效管理方面资料，根据评分规则，扣除100%权重分，本项指标得0.00分。	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评价要点	评分标准	评分过程	得分
						理记录是否保存完整。			
	D3 满意度 (10分)	D3.1 村民满意度	10.00	考察项目实施区域内村民对项目建设的满意程度。	≥90%	评价要点：满意度一般采用问卷调查的方式，满意度应达到90%以上。	满意度达到90%及以上得100%权重分，否则，每低于目标值1%，扣权重分的5%，扣完为止。	针对该项目的实施效果与投入使用情况，评价组对区域内村民进行问卷调查，共收回有效问卷181份，经统计周边村民对该项目的综合满意度达99.42%，满意程度较高。依据评分规则，本项指标得分10.00分。	10.00
合计			100.00	-	-	-	-	-	89.08

附件 2：满意度调查问卷

关堤乡青年路（Y001 乡道）改造提升工程项目绩效评价 满意度调查问卷

——（村民）

尊敬的先生/女士：

您好！为全面了解关堤乡青年路改造提升情况，特组织本次问卷调查，请您抽出几分钟时间填写以下问卷并给予宝贵意见。本次问卷调查数据仅限于统计分析使用，感谢您的支持和配合！

一、基本问题

1.请问您的年龄是？

20 岁以下

20-39 岁

40-59 岁

60 岁及以上

2.请问您所在的地区农村道路类型是？

水泥路

沥青路

碎石路

泥土路

其他

3.请问您认为现在的交通条件和前几年比有变化吗？

- 变化很大
- 变化很小
- 感觉没有变化

二、满意度问题

1.请问您是否满意青年路改造后的通行情况？

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

2.请问您是否满意青年路道路日常通行安全程度？

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

3.请问您是否满意现在出行的方便快捷程度？

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

4.请问您是否满意青年路路面及设施的维修维护情况？

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

5.请问您是否满意青年路整体建设完成情况?

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

6.请问您是否满意现在的乡村道路铺设情况?

- 非常满意
- 比较满意
- 一般
- 不太满意
- 非常不满意

7.请问您对道路建设方面还有哪些好的意见或建议:

附件 3：满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为青年路项目实施区域内各行政村村民。

（二）调研内容

主要调研受益对象对项目的建设过程、实施效果的满意程度以及直观感受，用以考察村民对该项目开展各项工作的满意情况。

二、调研方法与抽样方式


开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收


为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在线上小程序发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷 181 份，其中有效问卷 181 份，有效问卷回收率为 100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷分析


1. 请问您的年龄是？



2.请问您所在的地区农村道路类型是？

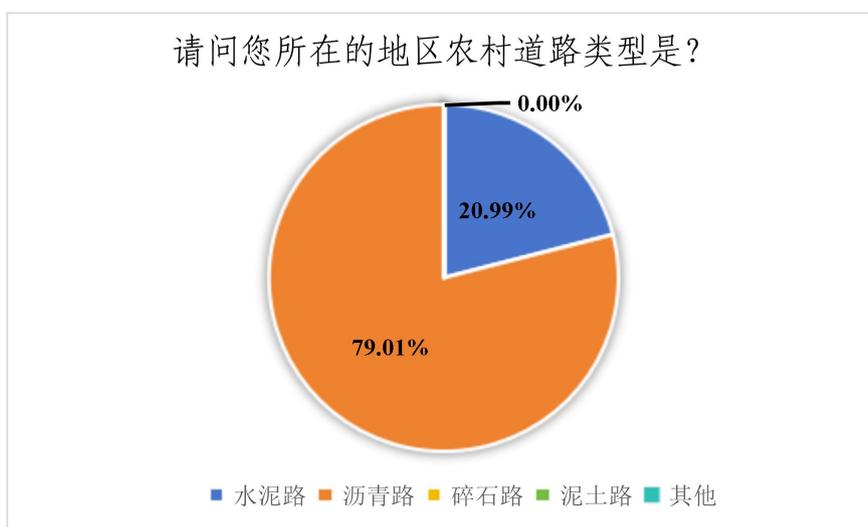

3.请问您认为现在的交通条件和前几年比有变化吗？

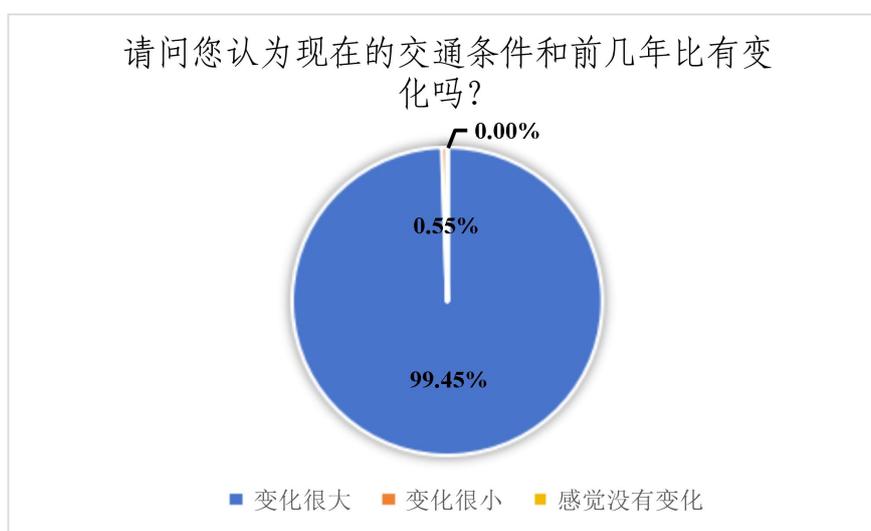


4.请问您是否满意青年路改造后的通行情况?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.59%	181	178	3	0	0	0
		98.34%	1.24%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题,了解周边村民对青年路改造后通行情况的满意程度。在回收的181份问卷中,村民的整体满意程度达到99.59%。其中,表示“非常满意”的占98.34%,表示“比较满意”的占1.66%,表示“一般”的占0.00%,表示“不太满意”的占0.00%,表示“非常不满意”的占0.00%。

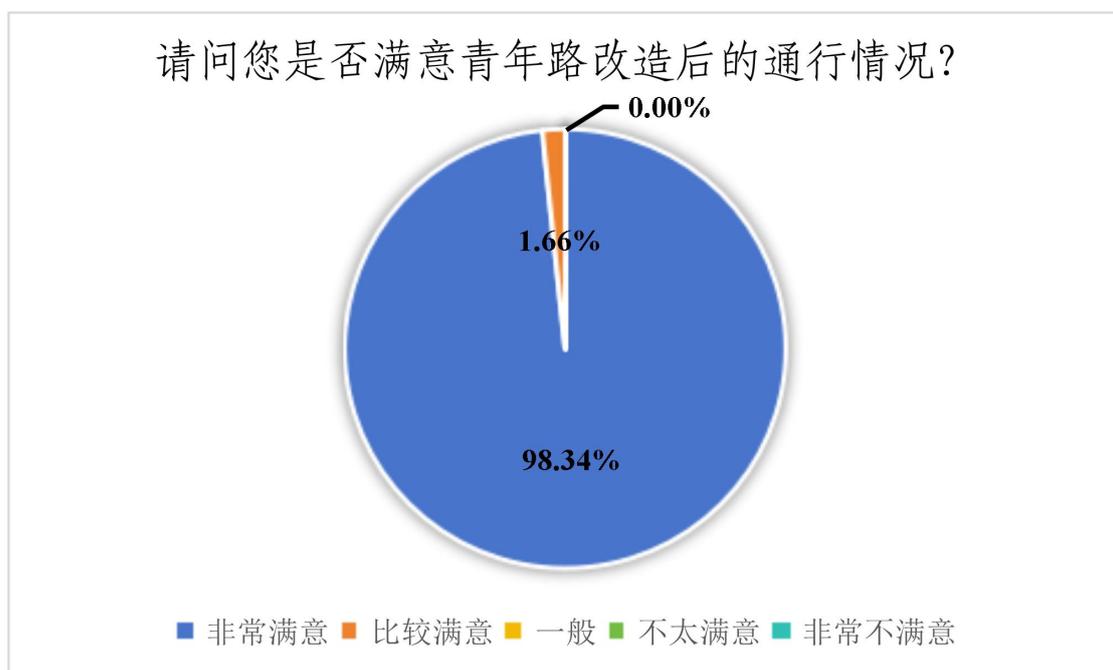


5.请问您是否满意青年路道路日常通行安全程度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.17%	181	175	6	0	0	0
		96.69%	2.49%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边村民对青年路改造后日常通行安全情况的满意程度。在回收的 181 份问卷中，村民的整体满意程度达到 99.17%。其中，表示“非常满意”的占 96.69%，表示“比较满意”的占 3.31%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

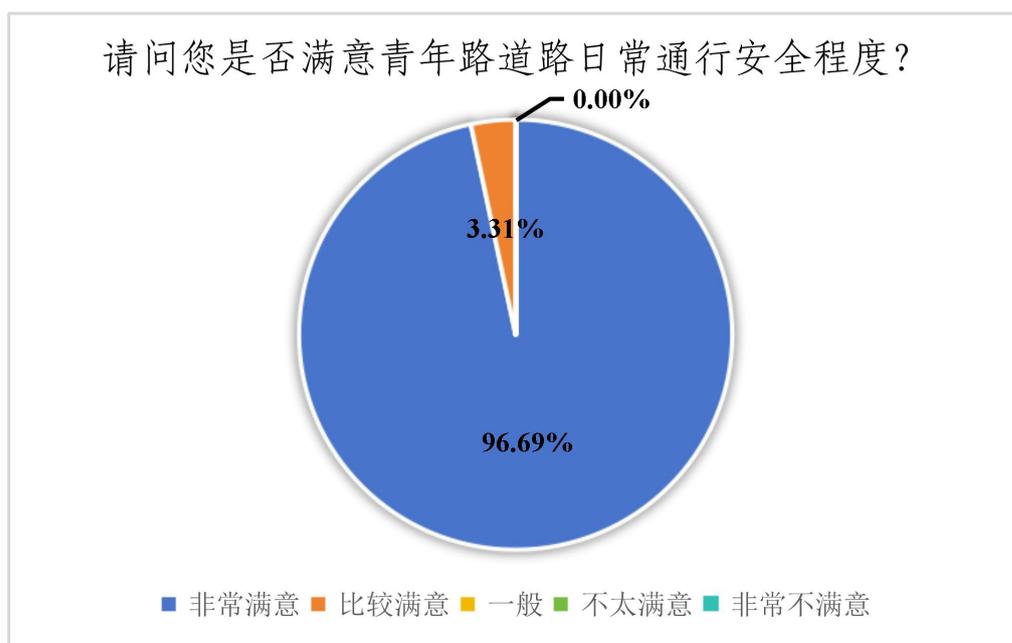


6.请问您是否满意现在出行的方便快捷程度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.31%	181	176	5	0	0	0
		97.24%	2.07%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边村民对青年路改造后出行的方便快捷情况的满意程度。在回收的 181 份问卷中，村民的整体满意程度达到 99.31%。其中，表示“非常满意”的占 97.24%，表示“比较满意”的占 2.76%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

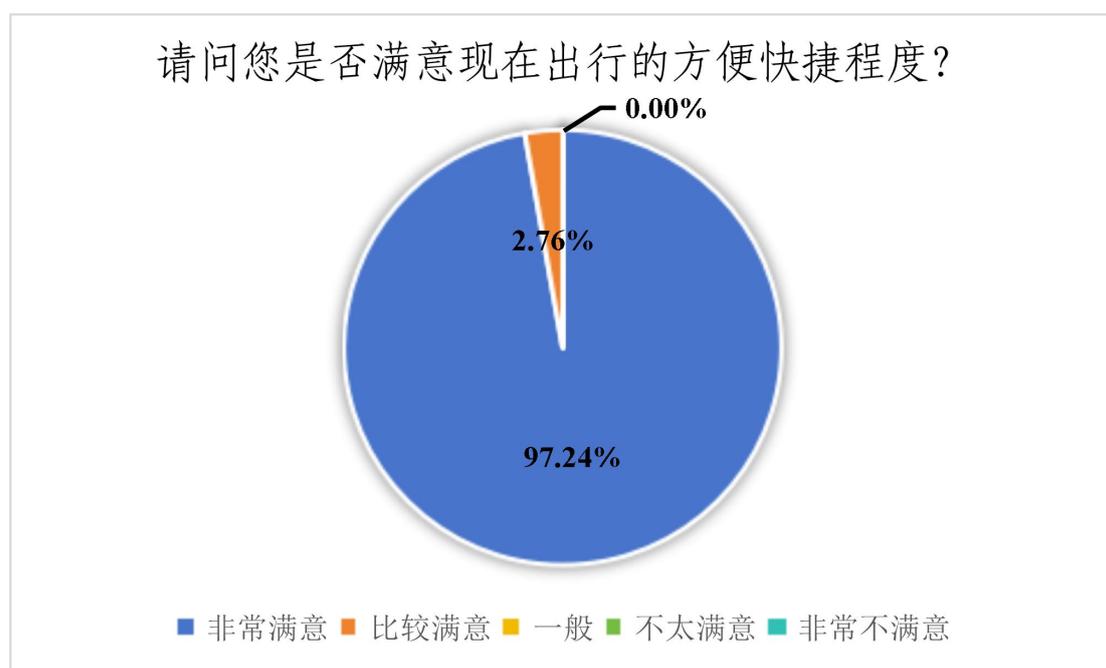


7.请问您是否满意青年路路面及设施的维修维护情况？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.72%	181	179	2	0	0	0
		98.90%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边村民对青年路改造后路面及设施的维修维护情况的满意程度。在回收的 181 份问卷中，村民的整体满意程度达到 99.72%。其中，表示“非常满意”的占

98.90%，表示“比较满意”的占 1.10%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

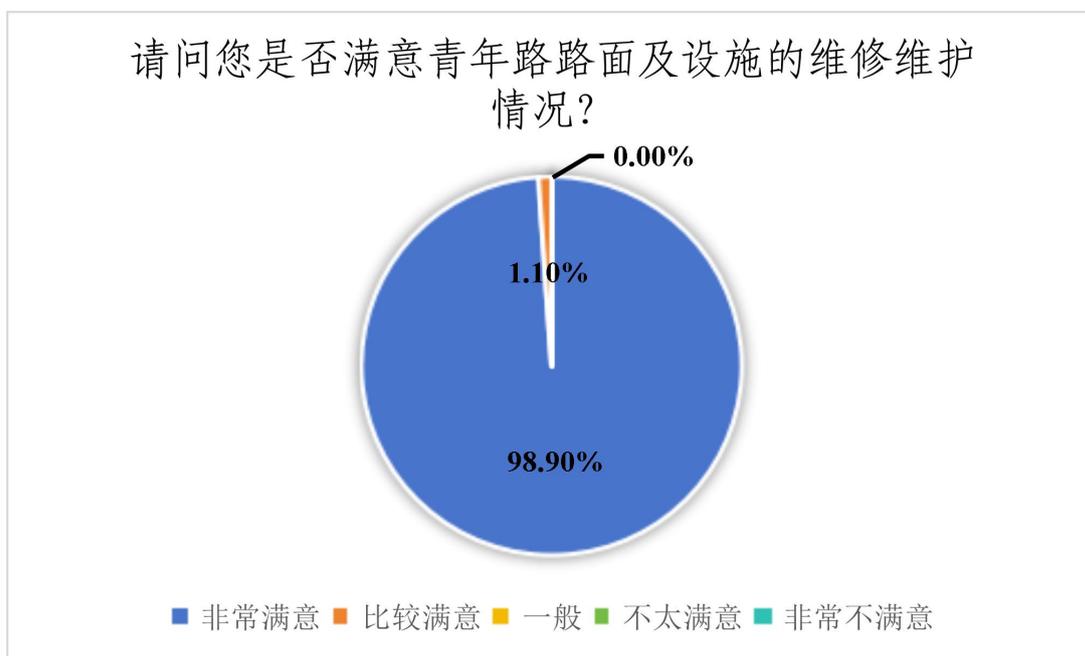


8.请问您是否满意青年路整体建设完成情况？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.72%	181	179	2	0	0	0
		98.90%	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边村民对青年路整体建设完成情况的满意程度。在回收的 181 份问卷中，村民的整体满意程度达到 99.72%。其中，表示“非常满意”的占 98.90%，表示“比较满意”的占 1.10%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

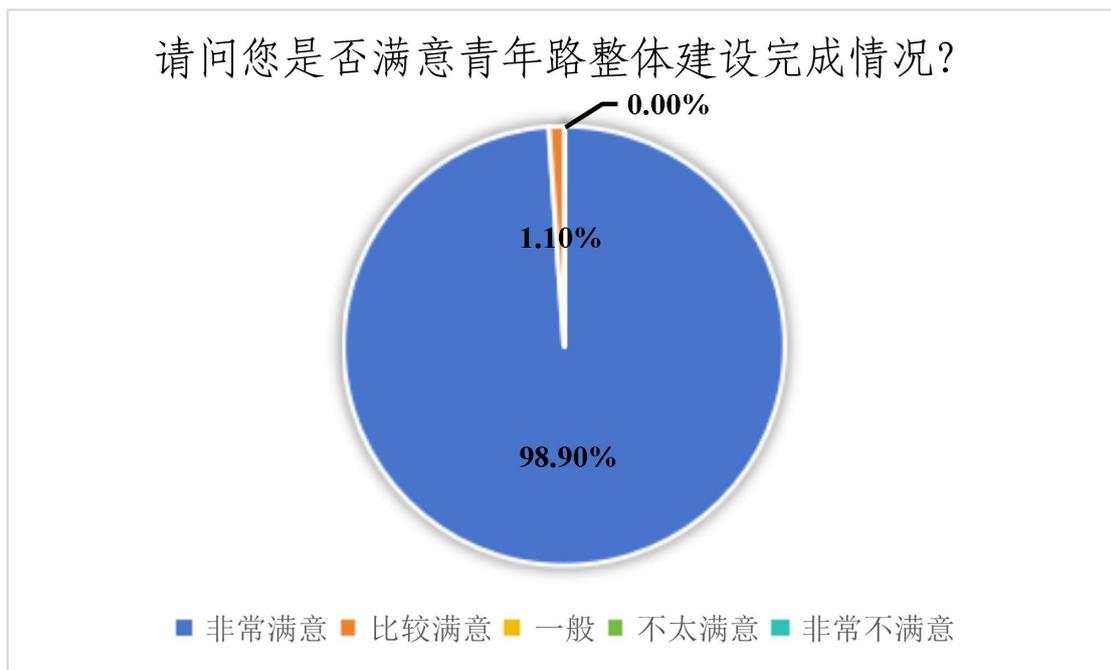


9.请问您是否满意现在的乡村道路铺设情况？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
99.03%	181	174	7	0	0	0
		96.13%	2.90%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边村民对现在的乡村道路铺设情况的满意程度。在回收的 181 份问卷中，村民的整体满意程度达到 99.03%。其中，表示“非常满意”的占 96.13%，表示“比较满意”的占 3.87%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

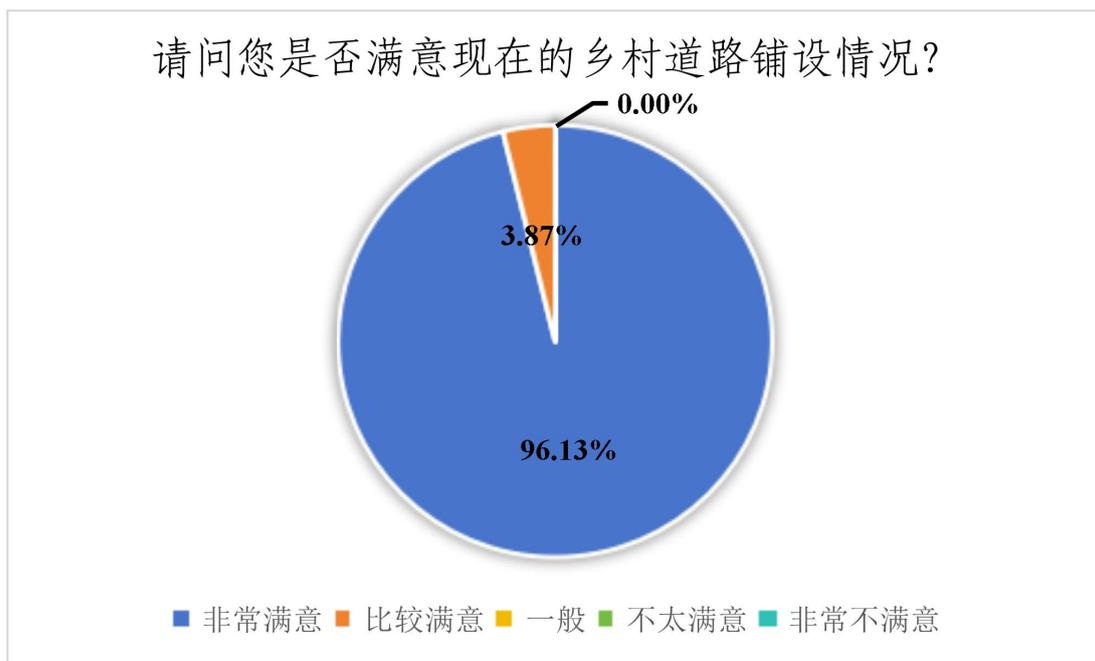

问卷调查总体结论：根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度达到 99.42%，其中：居民对路面及设施的维修维护、青年路整体建设完成情况满意度较高，对目前乡村道路铺设情况的满意度还有待继续提高。在居民提出的意见和建议中，121 人无意见，部分村民反映希望能够加大农村基础设施建设力度、提升道路景观、多布置一些交通监控设施以及在辖区内多增加车位等。

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
1.请问您是否满意青年路改造后的通行情况？	99.59%	98.34%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%
2.请问您是否满意青年路道路	99.17%	96.69%	3.31%	0.00%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
日常通行安全程度?						
3.请问您是否满意现在出行的方便快捷程度?	99.31%	97.24%	2.76%	0.00%	0.00%	0.00%
4.请问您是否满意青年路路面及设施的维修维护情况?	99.72%	98.90%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
5.请问您是否满意青年路整体建设完成情况?	99.72%	98.90%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%
6.请问您是否满意现在的乡村道路铺设情况?	99.03%	96.13%	3.87%	0.00%	0.00%	0.00%
综合满意度	99.42%					
