

新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市 道路工程项目绩效评价报告

主管部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会
自然资源规划建设局

委托单位：新乡高新技术产业开发区管理委员会财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2024年12月



摘要

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，河南云域网络科技有限公司受新乡高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）财政局委托，对高新区自然资源规划建设局负责实施的“新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目”开展绩效评价，形成此报告。

新乡高新区海河路(新原路-新飞大道)城市道路工程位于新乡高新区西南,道路等级为城市次干道路。本次计划修建道路范围西起新原路,东至新飞大道,道路起点桩号K0+007.84,终点桩号K0+698.09,道路全长约690米,红线宽度45米。本工程包含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程、电力管沟工程。项目已于2024年4月全部竣工验收完毕。本项目合同金额共计2,507.92万元,资金来源均为高新区财政资金,截至评价期结束,项目共计支出1,719.60万元,预算执行率为68.57%。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果,以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为85.57分,根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕

2号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“良”。

总体来看,新乡高新区海河路(新原路-新飞大道)城市道路工程项目立项决策层面,立项依据充分,立项程序规范,预算编制合理;项目过程管理层面,资金使用合规,项目管理制度健全,制度执行有效,政府采购流程合规,合同管理基本规范;产出层面,项目验收合格,未发生工程安全事故,项目整体完成较好,成本控制有效。项目建成后,完善了该区域内路网,改善了道路基础设施及周边居民出行条件,使道路通行能力得到较大提升;排水项目的建设有利于污、雨水分流,减轻了污水处理厂运行负荷,改善了城市水环境,提高了人民生活质量,有效的解决了城市内涝问题。

但是从评价组深入调研分析来看,项目目前存在以下问题: 1.项目完成情况与计划工程量存在偏差; 2.资金支付进度与合同约定进度相对滞后; 3.未对项目执行全过程绩效管理。

针对以上问题,评价组提出以下改进建议: 1.合理规划项目设计,规范项目管理; 2.加强合同管理,提高财政资金使用效益; 3.加强预算绩效学习,落实预算绩效管理工作。

目 录

摘 要	I
一、基本情况	1
(一) 项目立项的背景和目的	1
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 项目资金来源及支出情况	3
(四) 项目的组织及管理	4
(五) 项目绩效目标	7
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价依据	8
(三) 评价指标体系	10
(四) 绩效评价原则、方法和标准	12
(五) 绩效评价工作过程	15
三、综合评价情况及评价结论	17
(一) 综合评价情况	17
(二) 评价结论	17
四、绩效评价指标分析	18
(一) 项目决策情况	18
(二) 项目过程情况	20
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	25
五、主要经验及做法、存在的主要问题	27

(一) 主要经验及做法	27
(二) 存在的主要问题	28
六、有关建议	29
(一) 合理规划项目设计, 规范项目管理	29
(二) 加强合同管理, 提高财政资金使用效益	29
(三) 加强预算绩效学习, 落实预算绩效管理工作	30
七、其他需要说明的问题	30
八、附件	30
附件 1: 评价指标体系及评分表	32
附件 2: 满意度调查分析报告	56
附件 3: 主要工程计划与实际完成情况对比表	67

新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路 工程项目绩效评价报告

为贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，河南云域网络科技有限公司受新乡高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）财政局委托，对高新区自然资源规划建设局负责实施的“新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目”开展绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目立项的背景和目的

新乡高新区以提高自主创新能力为核心，以促进科技成果转化为重点，大力发展战略性新兴产业，壮大高新技术产业集群，注重培育有自主知识产权的优势主导产业。随着大力引进高新技术企业，新乡高新区对其基础设施建设提出了更高的要求。

新乡高新区是新乡市总体规划确定的中心城区，其地势较高，地质条件也较好，起步区路网基本完善，南环路以南区域主要骨架已经形成。海河路（新原路-新飞大道）位于新乡高新区西南部，作为高新区东西向联系的主要道路，往东可联系高新区东扩片区、新东产业区，往西可联系新乡市中心城区。由于历史原因造成该区域道路结构不均衡，道路

系统不完善，道路路网密度不够；重要交通节点、交通通道等所需用地预留不足。

为改变现状，高新区自然资源规划建设局对海河路提出建设规划，委托新乡市市政设计研究院有限公司研究制定《新乡高新区海河路城市道路工程（新原路-新飞大道）可行性研究报告（修编）》，对于项目建设提出明确具体规划。通过项目实施，可完善区域内路网，优化周边园区的生产发展条件和投资环境，为园区内大型项目的顺利建设实施及运行创造良好的基础条件。同时排水项目的建设有利于污、雨水分流，减轻污水处理厂运行负荷，改善城市水环境，提高人民生活质量，并有效的解决城市内涝问题。

（二）项目主要内容及实施情况

新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程位于新乡高新区西南，道路等级为城市次干道路。本次计划修建道路范围西起新原路，东至新飞大道，道路起点桩号 K0+007.84，终点桩号 K0+698.09，道路全长约 690 米，红线宽度 45 米。本工程包含道路工程、污水工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程、电力管沟工程。

本项目已于 2024 年 4 月全部竣工验收完毕，项目施工划分为三个标段，依据项目竣工验收证书具体实施完工内容见下表 1-1。

表 1-1 项目实施完工内容

标段	完工内容	竣工验收时间
一标段	<p>合同规定施工范围内的所有内容，主要包括：道路工程、污水工程、雨水工程、电力管沟工程、照明工程及交通工程。</p> <p>道路全长约 713m；污水管道敷设全长约 794m，检查井 24 座；雨水管道敷设全长约 1798m，检查井 46 座；电力管沟管道敷设全长约 15474m，电力井 13 座；照明保护管敷设全长约 5600.13m；交通标线约 1903 m²，信号灯安装 6 套，标志牌安装 7 套。</p>	2023.7.3
	海河路南北两侧人行道及受人行道施工影响的检查井、雨水口、路缘石等施工内容。	2023.10.24
二标段	<p>给水工程位于新乡高新区，设计范围西起新原路，东至新飞大道，给水管道施工范围为桩号 K0+001.45-K0+683.04，施工段全长 682 米，沿道路方向给水干管采用 DN300 球墨铸铁管 758 米，用户支管采用 DN200 球墨铸 153 米，消防栓支管采用 DN100 球墨铸铁管 21 米，管线位于海河路中 17.5 米，开槽施工，埋深≥1.5 米，与雨污水管道交叉时，管道采用下翻方式通过。</p>	2023.8.31
三标段	<p>1.绿化：造型油松 (17 株)；白皮松 (2 株)；红叶石树 (16 株)；法桐 (94 株)；西府海棠 (75 株)；晚樱 (24 株)；紫叶矮 (22 株)；金叶榆球 (21 株)；红叶石楠球 (18 株)；狼尾 (31 丛)；细叶芒 (21 丛)；景石 (11 块)；红叶石楠 (100 m²)；金森女贞 (25 m²)；大叶黄杨 (53 m²)；小龙柏 (34 m²)；欧石竹 (237 m²)；草皮 (2496 m²)；麦冬 (115.8 m²)。</p> <p>2.灌溉：管道 1487m，机井 1 座；配电箱 1 台，潜水泵 1 台；砌筑井 1 座。</p>	2024.4.17

(三) 项目资金来源及支出情况

根据项目单位提供的合同资料及资金支出明细账等相

关资料，项目合同金额共计 2,507.92 万元，资金来源均为高新区财政资金。截至评价期结束，项目共计支出 1,719.60 万元，预算执行率为 68.57%。项目预算资金明细见下表 1-2。

表 1-2 项目资金支出明细表

单位：万元

序号	实施内容	实施单位	合同金额	2022-2023 年支出	2024年 支出	合计
1	一标段	河南青龙建设集团有限公司	2,182.23	940.00	700.00	1,640.00
2	二标段	河南繁祥建设工程有限公司	66.06	-	-	-
3	三标段	河南永舜市政工程有限公司	137.71	-	-	-
4	四标段	河南诚信工程管理有限公司	22.43	-	-	-
5	勘察设计	新乡市市政设计研究院有限公司	99.50	79.60	-	79.60
合计			2,507.92	1,019.60	700.00	1,719.60

(四) 项目的组织及管理

1.相关方职责

高新区经济发展局：项目审批部门，负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

高新区财政局：负责项目预算审核、资金拨付及资金的监管。

高新区自然资源规划建设局：项目实施单位，负责项目

立项申请，项目预算的编制，项目规划建设，政府采购招标投标手续，签订项目合同，对项目进行验收，向财政申请项目资金以及项目绩效管理工作。

新乡市自然资源和规划局：负责审核及颁发《建设用地规划许可证》及《建设项目用地预审与选址意见书》。

招标代理机构（河南共城项目管理有限公司）：负责项目招标代理工作，完成项目采购的招标、评标，发布中标通知书等相关工作。

勘察设计单位（新乡市市政设计研究院有限公司）：负责项目前期的勘察设计，根据工程建设的要求和技术标准，出具施工图设计，负责项目后续服务工作。

施工单位（河南青龙建设集团有限公司、河南繁祥建设工程有限公司、河南永舜市政工程有限公司）：按照所签署合同，履行合同义务，按时保质保量完成施工任务，提交验收成果，接受高新区自然资源规划建设局监督约束等。

监理单位（河南诚信工程管理有限公司）：负责承担项目建设工程监理工作，对项目建设全过程进行监督检查、组织相关方参加施工图纸交底和会审；负责对项目建设相关方的关系进行沟通协调，促进项目顺利进行。

2.项目管理情况

（1）组织实施

本项目立项由高新区自然资源规划建设局依据各级人民政府的有关决策部署、区域发展规划等提出项目立项申

请，按规定开展调研论证、办理前期规划、用地、环评等手续，经项目审批部门通过后开始实施。实施阶段由项目单位通过招标代理机构公开招标确定施工单位，由施工单位按合同要求开展项目建设，实施过程中项目单位各部门按照各自职责分工及业务、财务管理制度对项目建设过程进行监督、管理，并按项目建设进度和合同约定申请、支付项目资金。项目验收阶段为施工方履约完毕及时向项目单位提出验收申请，项目单位在收到验收申请后及时组织相关单位开展验收等工作。

（2）资金管理

本项目纳入财政预算管理，按项目资金专款专用原则，严格按照国库集中支付和专项资金管理办法相关规定执行。

3.利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

- （1）项目拨款单位：高新区财政局；
- （2）项目主管部门：高新区自然资源规划建设局；
- （3）项目审批部门：高新区经济发展局；
- （4）项目勘察设计单位：新乡市市政设计研究院有限公司；
- （5）项目施工单位：河南青龙建设集团有限公司、河南繁祥建设工程有限公司、河南永舜市政工程有限公司；
- （6）项目监理单位：河南诚信工程管理有限公司；
- （7）项目受益方：人民群众。

(五) 项目绩效目标

1.项目总体目标

本项目的建设实施，可完善区域内路网，加强园区内部建设地块的联系，优化园区的生产发展条件和投资环境，为园区内大型项目的顺利建设实施及运行创造良好的基础条件。排水项目的建设有利于污、雨水分流，减轻污水处理厂运行负荷，改善城市水环境，提高人民生活质量，有效的解决城市内涝问题。

2.项目具体目标

评价组根据项目相关资料，进行了汇总梳理，梳理后的项目绩效目标见下表 1-3。

表 1-3 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤2,507.92 万元
产出指标	数量指标	道路长度	713.36 米
		道路红线宽度	45 米
		绿化面积	4153 平方米
	质量指标	项目完工验收合格率	100%
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	完善区域内路网	完善
		解决城市内涝问题	有效解决
		道路通行能力提升情况	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在全面梳理新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目资金投入使用、项目业务管理和实施等情况，分析项目实施各环节的合规性与合理性，总结项目开展中的成绩与经验，发现项目实施和资金管理中的问题与不足，有针对性地提出改进措施和建议，进一步加强财政预算资金管理，提高财政资金使用的经济性、效益性和效率性。

2. 评价对象

本次绩效评价对象为新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目，涉及财政资金规模为 2,507.92 万元。

3. 评价范围

本次绩效评价时间截至 2024 年 12 月，评价范围包括项目立项决策、过程管理、实施产出和实施效果等全过程。

(二) 绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次绩效评价依据包括但不限于以下文件：

1. 预算绩效管理类

(1) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(3) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

(4) 《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

(5) 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）；

(6) 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

(7) 《新乡市财政局关于印发<新乡市财政绩效评价指南>的通知》（新财效〔2022〕4号）。

2.业务管理类

(1) 《新乡市城市总体规划(2011-2020)》；

(2) 《新乡市城市综合交通体系规划》(2010-2020)；

(3) 《新乡高新技术产业开发区产业聚集区总体发展规划》(2009-2020)；

(4) 《新乡高新区海河路城市道路工程（新原路-新飞大道）可行性研究报告（修编）》；

(5) 国家颁布的相关建设法律法规、政策和标准。

3.其他类

(1) 评价组通过访谈和实地调查核实获取的资料;

(2) 其他相关资料,包括财政部门的预算批复、招标文件、相关管理制度、合同书、项目执行的财务及业务资料、反映项目产出及效果的佐证材料等。

(三) 评价指标体系

本次评价指标设计主要根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)文件要求,围绕“决策-过程-产出-效益”,确定绩效评价一二级指标。同时围绕新乡高新区海河路(新原路-新飞大道)城市道路工程项目决策、实施过程中业务及资金管理、制度落实情况及项目完成情等,确定三级指标名称,系统地开展指标体系的构建。绩效评价组根据项目评价需要将评价指标细分为3级,其中一级指标4个,二级指标12个,三级指标26个。指标数据主要来源于政策文件、业务及财务管理资料、访谈、现场核查、问卷调查等。具体指标体系框架构成见下表2-1。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (15分)	A1 项目立项	6.00	A1.1 立项依据充分性	3.00
			A1.2 立项程序规范性	3.00
	A2 绩效目标	5.00	A2.1 绩效目标合理性	2.00
			A2.2 绩效指标明确性	3.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
	A3 资金投入	4.00	A3.1 预算编制合理性	4.00
B 过程 (25分)	B1 资金管理	7.00	B1.1 预算执行率	3.00
			B1.2 资金使用合规性	4.00
	B2 业务管理	18.00	B2.1 管理制度健全性	3.00
			B2.2 制度执行有效性	4.00
			B2.3 项目采购规范性	3.00
			B2.4 合同管理规范性	4.00
			B2.5 绩效管理规范性	2.00
			B2.6 项目验收规范性	2.00
C 产出 (30分)	C1 产出数量	10.00	C1.1 道路施工实际完成情况	4.00
			C1.2 给水工程实际完成情况	2.00
			C1.3 绿化工程实际完成情况	2.00
			C1.4 灌溉工程实际完成情况	2.00
	C2 产出质量	10.00	C2.1 项目验收合格情况	5.00
			C2.2 工程安全事故发生次数	5.00
	C3 产出时效	5.00	C3.1 项目完成及时性	5.00
C4 产出成本	5.00	C4.1 项目成本控制有效性	5.00	
D 效益 (30分)	D1 社会效益	15.00	D1.1 完善区域内路网	5.00
			D1.2 解决城市内涝问题	5.00
			D1.3 道路通行能力提升情况	5.00
	D2 可持续影响	6.00	D2.1 长效管理机制健全性	6.00
	D3 满意度	9.00	D3.1 群众满意度	9.00
合计		100.00	*	100.00

1.决策类指标: 占权重为 15 分, 从项目立项、绩效目标、

资金投入等 3 个方面进行考察。主要考察立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制合理性等。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

2.过程类指标：占权重为 25 分，主要从资金管理、业务管理等 2 个方面进行考察。主要考察预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目采购规范性、合同管理规范性、绩效管理规范性、项目验收规范性等。包括 2 个二级指标，8 个三级指标。

3.产出类指标：占权重为 30 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等 4 个方面进行考察。主要考察道路施工实际完成情况、给水工程实际完成情况、绿化工程实际完成情况、灌溉工程实际完成情况、项目验收合规情况、工程安全事故发生次数、项目完成及时性、项目成本控制有效性等。包括 4 个二级指标，8 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 30 分，主要从社会效益、可持续影响、受益对象满意度等 3 个方面进行考察。主要考察完善区域内路网、解决城市内涝问题、道路通行能力提升情况、长效管理机制健全性、群众满意度等。包括 3 个二级指标，5 个三级指标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价原则、方法和标准

1.评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析项目的立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合评价项目实施及资金支出的效益。

2.评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定性相结合的评价方法，主要采用以下方法：

（1）比较法

评价组通过对项目整体规划目标与实施效果、历史与当期等情况比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入是否科学、项目实施内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

（2）因素分析法

评价组在通过多种方式充分了解项目目前实施、使用情况的基础上，结合对项目单位相关责任人员访谈，查阅项目决策、监督、管理等过程记录文件，找出项目绩效目标实现或未实现的内外部原因，分析各种因素对项目绩效目标实现的影响程度，并针对这些因素提出合理有效建议。

（3）综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目实施成效进行综合、全面的评价。

（4）公众评判法

评价组针对项目资金支付进度、实施质量、监督管理情况以及受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解项目主管部门和项目受益对象对项目建设管理的满意程度和相关意见、建议，分析项目实施、管理是否符合受益对象的现实需求。

（5）社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对项目实施完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

（6）其他评价方法

评价组根据上述评价工作的进展情况，视工作需要而采取的其他方法。

3.评价标准

本次绩效评价的标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准。

（4）其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价分为四个阶段，分别为前期准备、方案制定、评价实施、成果出具，工作期间为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 12 月 20 日，将于 2024 年 12 月 20 日前完成报告终稿提交区财政局，各阶段工作内容及时间安排见下表 2-2。

表 2-2 绩效评价工作内容及时间安排

阶段	时间	工作内容
前期准备	10 月 14 日	组建绩效评价工作组： 根据评价项目情况成立绩效评价小组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。
	10 月 14 日	对接财政局： 评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位： 评价组对接项目实施单位负责人，下发绩效评价资料清单。
	10 月 15 日—10 月 16 日	了解项目政策背景： 评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	10 月 17 日—10 月 22 日	初步收集资料： 评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
	10 月 23 日—10 月 27 日	开展前期调研： 评价组对收集到的项目资料进行汇总、分析和整理，在与项目单位沟通访谈的基础上，充分了解项目的背景、绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理等，为制定切实可行的评价指标体系奠定基础。

阶段	时间	工作内容
方案制定	10月28日—11月6日	编制绩效评价工作方案： 评价组根据前期调研情况及收集到的资料，对项目资料进行梳理分析，运用科学的指标设计原则，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	11月7日—11月10日	评价工作方案征求意见： 评价组在完成评价工作方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
评价实施	11月11日—11月13日	补充资料收集： 评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，视现有资料提交情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
	11月14日—11月30日	现场调研及访谈： 主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。根据项目特点，评价组选取不同的方式进行现场调研，收集评价所需基础数据，并对不同关联方进行访谈。
		问卷调研： 评价组按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，并对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具	12月1日—12月12日	出具评价报告初稿： 在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式和内容撰写评价报告，经三级复核后，形成评价报告初稿。
	12月13日—12月18日	评价报告初稿征求意见： 评价组向区财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见，修改后形成评价报告正式稿。

阶段	时间	工作内容
	12月20日之前	报送正式评价报告：评价组根据评价工作要求向区财政局报送并装订正式绩效评价报告。
		资料归档：评价组在本次评价工作结束后，分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目立项决策层面，立项依据充分，立项程序规范，预算编制合理；项目过程管理层面，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效，政府采购流程合规，合同管理基本规范；产出层面，项目验收合格，未发生工程安全事故，项目整体完成较好，成本控制有效。项目建成后，完善了该区域内路网，改善了道路基础设施及周边居民出行条件，使道路通行能力得到较大提升；排水项目的建设有利于污、雨水分流，减轻了污水处理厂运行负荷，改善了城市水环境，提高了人民生活质量，有效的解决了城市内涝问题。

但是从评价组深入调研分析来看，项目目前存在以下问题：1.项目完成情况与计划工程量存在偏差；2.资金支付进度与合同约定进度相对滞后；3.未对项目执行全过程绩效管理。

（二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评

分。最终项目得分为 85.57 分，根据《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“良”。具体得分情况见下表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 决策	15.00	10.00	66.67%
B 过程	25.00	21.06	84.24%
C 产出	30.00	26.00	86.67%
D 效益	30.00	28.51	95.03%
合计	100.00	85.57	85.57%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标共 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共 15.00 分，实际得分 10.00 分，得分率 66.67%。三级指标得分情况见下表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	6.00	6.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	3.00	3.00	100.00%
A2 绩效目标	5.00	0.00	0.00%
A2.1 绩效目标合理性	2.00	0.00	0.00%
A2.2 绩效指标明确性	3.00	0.00	0.00%
A3 资金投入	4.00	4.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
A3.1 预算编制合理性	4.00	4.00	100.00%
合计	15.00	10.00	66.67%

A1.1 立项依据充分性：根据项目单位提供的资料：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，要点①得满分；②项目立项符合《新乡市城市总体规划(2011-2020)》、《新乡市城市综合交通体系规划》(2010-2020)等相关行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为高新区自然资源规划建设局，项目立项与该部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于高新区财政资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④得满分；⑤经审阅部门职责和相关资料，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复，要点⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A1.2 立项程序规范性：根据项目单位提供的资料：①项目由高新区自然资源规划建设局向高新区经济发展局申请，高新区经济发展局进行了审核批复，同意项目的实施，并对项目建设内容、资金来源及招投标等事项作出了批复，项目按照规定的程序设立，要点①得满分；②项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目事前进行了可行性研究，并形成报告，组织专家组对可研报告进行评审，经相关部门审核批复，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

A2.1 绩效目标合理性: 项目单位未提供项目绩效目标申报表, 评价组无法判断项目绩效指标设置合理性情况, 本项指标得 0.00 分。

A2.2 绩效指标明确性: 项目单位未提供项目绩效目标申报表, 评价组无法判断项目绩效指标设置明确性情况, 本项指标得 0.00 分。

A3.1 预算编制合理性: 根据项目单位提供的资料: 预算资金由河南联创工程造价管理有限公司编制, 并经财政预算投资评审部门审核, 预算编制科学, 测算依据充分, 预算内容与项目实际内容相匹配, 预算确定的项目投资额与年度工作任务相匹配。综上, 本项指标得 4.00 分。

(二) 项目过程情况

过程指标共 2 个二级指标, 8 个三级指标, 权重分值共 25.00 分, 实际得分 21.06 分, 得分率 84.24%。三级指标得分情况见下表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	7.00	6.06	86.57%
B1.1 预算执行率	3.00	2.06	68.67%
B1.2 资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
B2 业务管理	18.00	15.00	83.33%
B2.1 管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%
B2.2 制度执行有效性	4.00	4.00	100.00%
B2.3 项目采购规范性	3.00	3.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
B2.4 合同管理规范	4.00	3.00	75.00%
B2.5 绩效管理规范	2.00	0.00	0.00%
B2.6 项目验收规范	2.00	2.00	100.00%
合计	25.00	21.06	84.24%

B1.1 预算执行率：根据项目单位提供的资料：项目合同资金共计 2,507.92 万元，全部来源于高新区财政资金，由国库直接拨付至项目施工单位，截至评价期已支付 1,719.6 万元，预算执行率=1,719.6/2,507.92 × 100%=68.57%。依据评分规则，本项指标得 68.57% × 3=2.06 分。

B1.2 资金使用合规性：评价组通过核查项目单位财务资料：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，要点①得满分；②项目资金从拨付到使用有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③项目资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④项目资金使用由高新区财政国库支付中心直接拨付至最终收款方，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.1 管理制度健全性：经评价组核查，项目单位制定了《财务报账管理办法》《采购与付款内部控制制度》《固定资产管理暂行办法》《预决算管理内部控制制度》《工程项目建设内控管理制度》《合同管理内部控制制度》等相关业务制度，对项目单位的资产管理、采购管理、预决算管理、

财务审批报账管理及相关业务管理等进行明确规定，其内容合法、合规、完整，符合评价要点①②。综上，本项指标得 3.00 分。

B2.2 制度执行有效性：经评价组核查项目资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目调整及变更手续完备，资料齐全，要点②得满分；③项目合同书、验收报告、施工日志、监理报告、技术鉴定、报账材料等资料齐全并及时归档，要点③得满分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。

B2.3 项目采购规范性：评价组通过核查采购招投标资料：该项目采购活动均采用公开招标方式，符合政府采购管理和部门采购管理规定，采购实施程序规范，符合政府采购相关流程。综上，本项指标得分 3.00 分。

B2.4 合同管理规范：经评价组核查：①本项目按照采购要求及时签订了合同，要点①得满分；②该项目所签订的合同中明确了工程概况、合同工期、质量要求、付款方式及双方职责等，要素齐全，内容明确，表述清晰，要点②得满分；③项目实施过程基本按照签订的合同执行，但在合同执行过程中存在未按合同约定的付款方式付款，如：二标段合同中约定的付款方式“工程竣工验收合格并正常通水后支付至已完工程造价金额（不含签证、变更）的 80%”，三标段合同中约定的付款方式“绿化工程完工并验收合格后，当年支

付绿化工程合同价款的 40%”，四标段监理合同中约定的付款方式“工程完工验收合格，支付至合同价款的 80%”，二标段已在 2023 年完成竣工验收，三标段在 2024 年上半年完成竣工验收，但截至评价期结束，二~四标段均未进行实际支付。因此，要点③得 25%权重分。综上，得 75%权重分，本项指标得 3.00 分。

B2.5 绩效管理规范性：项目单位未提供项目绩效相关工作资料，本项指标得 0.00 分。

B2.6 项目验收规范性：经评价组核查：本项目工程完工后及时进行了竣工验收，且验收流程规范，验收资料齐全。综上，本项指标得 2.00 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 4 个二级指标，8 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 26.00 分，得分率 86.67%。三级指标得分情况见下表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10.00	6.00	60.00%
C1.1 道路施工实际完成情况	4.00	2.00	50.00%
C1.2 给水工程实际完成情况	2.00	2.00	100.00%
C1.3 绿化工程实际完成情况	2.00	0.00	0.00%
C1.4 灌溉工程实际完成情况	2.00	2.00	100.00%
C2 产出质量	10.00	10.00	100.00%
C2.1 项目验收合格情况	5.00	5.00	100.00%

指标	权重	得分	得分率
C2.2 工程安全事故发生次数	5.00	5.00	100.00%
C3 产出时效	5.00	5.00	100.00%
C3.1 项目完成及时性	5.00	5.00	100.00%
C4 产出成本	5.00	5.00	100.00%
C4.1 项目成本控制有效性	5.00	5.00	100.00%
合计	30.00	26.00	86.67%

C1.1 道路施工实际完成情况: 根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单, 项目道路工程、污水工程、雨水工程 3 项的完成情况与计划工程量基本一致, 但电力工程、照明工程、交通工程完成情况与计划工程量存在偏差较大, 如: 电力管沟管道计划敷设 16294m, 实际完成 15474m; 照明工程计划新安装 45 套, 实际未完成; 交通工程中各项标志牌安装及更换计划 52 套, 实际完成 7 套, 信号灯计划 33 套, 实际完成 6 套等 (详见附件 3)。依据评分标准, 扣权重分的 3/6, 本项指标得 2.00 分。

C1.2 给水工程实际完成情况: 根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单, 项目给水工程完成情况与计划工程量基本一致。依据评分标准, 本项指标得 2.00 分。

C1.3 绿化工程实际完成情况: 根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单, 项目绿化工程中栽种绿植数量及面积与计划量均不一致, 如: 造型油松计划数量 44 株, 实际完成 17 株, 红叶石楠树计划 38 株, 实际完成 16 株; 金森女贞计划 278 m², 实际完成 25 m²等 (详见附件 3)。依

据评分标准，本项指标得 0.00 分。

C1.4 灌溉工程实际完成情况：根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单，灌溉工程完成情况与计划工程量基本一致。依据评分标准，本项指标得 2.00 分。

C2.1 项目验收合格情况：经评价组查阅项目单位提供的竣工验收资料，建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等参与项目验收，3 个标段均验收合格。依据评分标准，本项指标得 5.00 分。

C2.2 工程安全事故发生次数：根据收集的基础数据资料及访谈情况，该项目在实施过程中，并未发生工程安全事故问题。依据评分标准，本项指标得 5.00 分。

C3.1 项目完成及时性：经评价组核查项目相关资料，1 标段合同约定工期为 365 日历天，2 标段、3 标段合同约定工期均为 60 日历天，该项目 3 个标段均在计划工期内完成施工。依据评分标准，本项指标得 5.00 分。

C4.1 项目成本控制有效性：经评价组核查项目相关资料，项目招标控制总价为 2,780.20 万元，中标总金额为 2,507.92 万元，成本控制有效。综上，本项指标得 5.00 分。

(四) 项目效益情况

效益指标共 3 个二级指标，5 个三级指标，权重分值共 30.00 分，实际得分 28.51 分，得分率 95.03%。三级指标得分情况见下表 4-4。

表 4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	15.00	14.01	93.40%
D1.1 完善区域内路网	5.00	5.00	100.00%
D1.2 解决城市内涝问题	5.00	4.01	80.20%
D1.3 道路通行能力提升情况	5.00	5.00	100.00%
D2 可持续影响	6.00	6.00	100.00%
D2.1 长效管理机制健全性	6.00	6.00	100.00%
D3 满意度	9.00	8.50	94.44%
D3.1 群众满意度	9.00	8.50	94.44%
合计	30.00	28.51	95.03%

D1.1 完善区域内路网：经评价组核查项目资料及现场调研：①道路均设有路标路牌和交通警示标志，要点①得满分；②机动车道、非机动车道、人行道区域划分明确，确保了分道通行，要点②得满分；③该项目实施区域内无明显破损等安全隐患，要点③得满分。综上，本项指标得 5.00 分。

D1.2 解决城市内涝问题：通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷 147 份。评价组通过分析问卷，对解决城市内涝问题的满意程度为 86.05%。依据评分规则，本项指标得 $5 \times [1 - (90\% - 86.05\%) \times 5\%] = 4.01$ 分。

D1.3 道路通行能力提升情况：通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷 147 份。评价组通过分析问卷，对道路通行能力提升的满意程度为 90.31%。依据评分规则，本项指标得 5.00 分。

D2.1 长效管理机制健全性：合同约定该项目道路工程完

工后由项目施工单位管护一年，后移交高新区执法局，绿化工程完工后由施工单位管护两年，后移交高新区城市绿化行政主管部门进行管护。评价组通过核查项目资料，并经现场访谈了解：道路工程于2023年7月竣工验收，截至评价期结束，因路灯设施未完善暂未办理交接手续；绿化工程于2024年4月竣工验收，目前在施工单位管护期间。高新区城市绿化行政主管部门目前正在完善园林绿化管理的相关考核办法，办法中明确管护责任方，并对其养护和管理工作设有详细的考核标准。综上，本项指标得6.00分。

D3.1 群众满意度：通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷147份。评价组通过分析问卷，项目区域群众对该项目建设的综合满意程度为88.88%。依据评分规则，本项指标得 $9 \times [1 - (90\% - 88.88\%) \times 5\%] = 8.50$ 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

1.有效协调各实施单位，有序推进项目实施

高新区自然资源规划建设局作为主体单位，落实资金来源，完成了项目可行性研究报告、施工图设计、工程预算书及施工许可等文件批复工作。项目建设方面成立项目实施小组，负责项目整体工作、制定各项管理制度，落实项目政策，全权负责项目的实施、进度检查、质量监督、组织竣工验收、资料留存等工作，项目管理结果整体较好，各项工作有秩序推进，为项目实施创造了良好条件。

2.各部门协同合作，城市绿化精细化管理

该项目道路绿化施工于 2024 年上半年完成竣工验收，根据合同约定由施工单位负责道路绿化管护 2 年，后移交高新区自然资源规划建设局交通林业科。为进一步加强和规范高新区区域道路高质量、可持续发展，巩固绿化建设成果，高新区自然资源规划建设局交通林业科正在研究制定园林绿化精细化管理考核办法，将对高新区道路绿化管护实行精细化管理，经评价组查看该管理考核办法初稿，办法中明确管护责任方，并对植物养护、设施维护、安全生产、文明创建、资料台账设有详细的考核标准，且该办法还在逐步完善中。

(二) 存在的主要问题

1.项目完成情况与计划工程量存在偏差

根据项目单位提供的项目资料及实地调研，项目施工完成情况与计划工程量存在较大偏差，如：电力管沟管道计划敷设 16294m，实际完成 15474m；照明工程计划新安装 45 套，实际未完成；交通工程中各项标志牌安装及更换计划 52 套，实际完成 7 套，信号灯计划 33 套，实际完成 6 套，造型油松计划数量 44 株，实际完成 17 株，红叶石楠树计划 38 株，实际完成 16 株；金森女贞计划 278 m²，实际完成 25 m² 等（详见附件 3）。

2.资金支付进度与合同约定进度相对滞后

项目单位在工程费用支付方面，未严格按照合同约定的支付节点进行支付，存在违约风险，如：二标段合同中约定

的付款方式“工程竣工验收合格并正常通水后支付至已完工程造价金额(不含签证、变更)的80%”，三标段合同中约定的付款方式“绿化工程完工并验收合格后，当年支付绿化工程合同价款的40%”，四标段监理合同中约定的付款方式“工程竣工验收合格，支付至合同价款的80%”，二标段已在2023年完成竣工验收，三标段在2024年上半年完成竣工验收，但截至评价期结束，二~四标段均未进行实际支付。

3.未对项目执行全过程绩效管理

项目单位对预算绩效管理的认识不到位，未设置项目绩效目标和绩效指标，未执行全过程绩效管理，导致财政资金导向作用不突出。

六、有关建议

(一) 合理规划项目设计，规范项目管理

建议项目单位在做同类项目时，在项目施工前做好充分的前期调研，加强实地勘察，提高工程设计的准确性，避免出现工程量增加或变更较大的情况；在项目整个实施过程中应加强跟踪与监管，如遇设计、工程量变更等情况，及时做好相关方案的调整，保证工程完成及时性。

(二) 加强合同管理，提高财政资金使用效益

建议高新区自然资源规划建设局根据合同约定及时支付合同价款。加强合同管理力度，财务及业务等相关部门定期进行合同履行情况的监督和评估，及时发现和处理项目实施进度与合同执行情况，确保多角度审查和风险控制，降低

合同履行风险。同时，建议项目单位构建完善的资金管理制度框架，保证资金监督管理有据可依、有章可循，提高财政资金使用效益。

（三）加强预算绩效学习，落实预算绩效管理工作

建议项目单位提高绩效管理意识，加强预算绩效管理的学习培训，树立“全方位、全过程、全覆盖”绩效管理理念，把预算绩效管理工作落到实处。一是抓实绩效目标设置，编制预算时要按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，将绩效目标管理涵盖到所有预算资金和项目，在绩效目标设置时需立足实际，做好充分调查，制定科学可行的目标，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。二是构建全过程预算绩效管理链条，开展事前绩效评估、绩效运行“双监控”和绩效评价工作，建立绩效跟踪机制，发现问题及时纠正，总结问题提炼经验，为下一步项目的改进和完善提供重要支撑。

七、其他需要说明的问题

（一）本报告基础资料由高新区自然资源规划建设局提供并对其真实性负责。

（二）本次评价工作是在评价小组和项目单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影评价报告使用者予以关注。

八、附件

附件 1: 评价指标体系及评分表

附件 2: 满意度调查分析报告

附件 3: 主要工程计划与实际完成情况对比表

附件 1：评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (15分)	A1 项目立项 (6分)	A1.1 立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	根据项目单位提供的资料：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，要点①得满分；②项目立项符合《新乡市城市总体规划(2011-2020)》、《新乡市城市综合交通体系规划》(2010-2020)等相关行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为高新区自然资源规划建设局，项目立项与该部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于高新区财政资金，属	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④得满分；⑤经审阅部门职责和相关资料，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复，要点⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
		A1.2 立项程序规范性	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序设立；②项目审批文件、材料是否符合相关要求；③项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	根据项目单位提供的资料：①项目由高新区自然资源规划建设局向高新区经济发展局申请，高新区经济发展局进行了审核批复，同意项目的实施，并对项目建设内容、资金来源及招投标等事项作出了批复，项目按照规定	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						险评估、绩效评估、集体决策等。		的程序设立，要点①得满分；②项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点②得满分；③项目事前进行了可行性研究，并形成报告，组织专家组对可研报告进行评审，经相关部门审核批复，要点③得满分。综上，本项指标得 3.00 分。	
	A2 绩效 目标 (5 分)	A2.1 绩效 目标 合理 性	2.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反	合理	评价要点：①项目是否有全面清晰的绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效	四项都符合 得 100%权重分，有一项不符合扣权重分	项目单位未提供项目绩效目标申报表，评价组无法判断项目绩效指标设置合理性情况，本项指标得 0.00 分。	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	的 25%。		
		A2.2 绩效 指标 明确 性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	项目单位未提供项目绩效目标申报表，评价组无法判断项目绩效指标设置明确性情况，本项指标得 0.00 分。	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
	A3 资金投入 (4分)	A3.1 预算编制 合理性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	评价要点：①预算编制是否是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	根据项目单位提供的资料：预算资金由河南联创工程造价管理有限公司编制，并经财政预算投资评审部门审核，预算编制科学，测算依据充分，预算内容与项目实际内容相匹配，预算确定的项目投资额与年度工作任务相匹配。综上，本项指标得4.00分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
B 过程 (25分)	B1 资金管理 (7分)	B1.1 预算执行率	3.00	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	与计划资金量一致得 100%权重分, 否则按实际完成金额的比例得相应权重分。	根据项目单位提供的资料: 项目合同资金共计 2,507.92 万元, 全部来源于高新区财政资金, 由国库直接拨付至项目施工单位, 截至评价期已支付 1,719.6 万元, 预算执行率=1,719.6/2,507.92×100%=68.57%。依据评分规则, 本项指标得 68.57%×3=2.06 分。	2.06
		B1.2 资金使用合规性	4.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付	四项都符合得 100%权重分, 有一项不符合	评价组通过核查项目单位财务资料: ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定, 要点①得满分; ②项目资金从拨付到使用有完整的审批程	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				映和考核项目资金的规范运行情况。		是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	扣权重分的 25%。若缺少要素③或④的情况，该项指标不得分。	序和手续，要点②得满分；③项目资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④项目资金使用由高新区财政国库支付中心直接拨付至最终收款方，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	
	B2 业务管理 (18 分)	B2.1 管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合	经评价组核查，项目单位制定了《财务报账管理办法》《采购与付款内部控制制度》《固定资产管理暂行办法》《预决算管理内部控制制度》《工程项目建设内	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		完整。	扣权重分的 50%。	控管理制度》《合同管理内部控制制度》等相关业务制度，对项目单位的资产管理、采购管理、预决算管理、财务审批报账管理及相关业务管理等进行明确规定，其内容合法、合规、完整，符合评价要点①②。综上，本项指标得 3.00 分。	
		B2.2 制度 执行 有效 性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有	有效	评价要点：①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及变更手续是否完备；③项目合同书、验收报	四项都符合 得 100%权重分，有一项不符合扣权重分	经评价组核查项目资料：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②项目调整及变更手续完备，资料齐全，要点②得满分；③项目合同书、验收报告、施工日志、监理	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				效执行情况。		告、施工日志、监理报告、技术鉴定、报账材料等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	的 25%。	报告、技术鉴定、报账材料等资料齐全并及时归档，要点③得满分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，要点④得满分。综上，本项指标得 4.00 分。	
		B2.3 项目 采购 规范 性	3.00	考察采购程序是否符合政府采购相关规定，是否严格、规范的执行政府采	规范	评价要点：①采购活动是否按照政府采购相关标准采用合适的采购方式；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	评价组通过核查采购招投标资料：该项目采购活动均采用公开招标方式，符合政府采购管理和部门采购管理规定，采购实施程序规范，符合政府采购相关流程。综上，本项指标得分 3.00 分。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				购程序。		流程的规定。			
		B2.4 合同 管理 规范 性	4.00	考察合同管理是否有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全、约定明确，执行有效。	规范	评价要点：①是否按照采购要求订立合同(含延续合同、变更合同)；②合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；③是否按合同规定要素执行。	要点①②各占权重分25%，要点③占权重分50%。	经评价组核查：①本项目按照采购要求及时签订了合同，要点①得满分；②该项目所签订的合同中明确了工程概况、合同工期、质量要求、付款方式及双方职责等，要素齐全，内容明确，表述清晰，要点②得满分；③项目实施过程基本按照签订的合同执行，但在合同执行过程中存在未按合同约定的付款方式付款，如：二标段合同中约定的付款方式“工程竣工验收合格并正常通水后支付至已完工程造价金额	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								<p>(不含签证、变更)的 80%”，三标段合同中约定的付款方式“绿化工程完工并验收合格后，当年支付绿化工程合同价款的 40%”，四标段监理合同中约定的付款方式“工程完工验收合格，支付至合同价款的 80%”，二标段已在 2023 年完成竣工验收，三标段在 2024 年上半年完成竣工验收，但截至评价期结束，二~四标段均未进行实际支付。因此，要点③得 25%权重分。综上，得 75%权重分，本项指标得 3.00 分。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		B2.5 绩效管理 规范性	2.00	考察项目实施单位是否按照绩效管理要求开展绩效监控与绩效自评工作。	规范	评价要点：①是否开展绩效监控工作并有效提交绩效运行监控表、绩效运行监控报告；②绩效监控表、绩效监控报告是否填报完整、客观；③是否开展绩效自评工作并有效提交项目绩效自评表、项目绩效自评报告；④项目绩效自评表、项目绩效自评报告是否填报完整、客观。	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	项目单位未提供项目绩效相关工作资料，本项指标得0.00分。	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		B2.6 项目验收规范性	2.00	考察项目完成后，是否规范、有效开展项目验收活动。	规范	评价要点：①项目工程完工后是否及时进行验收；②验收流程是否规范，验收资料是否齐全。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	经评价组核查：本项目工程完工后及时进行了竣工验收，且验收流程规范，验收资料齐全。综上，本项指标得2.00分。	2.00
C产出 (30分)	C1产出数量 (10分)	C1.1 道路施工实际情况	4.00	考察该项目道路施工完成情况与计划是否一致。	100%	评价要点：道路工程、污水工程、雨水工程、电力工程、照明工程、交通工程完成情况与招标工程量清单一致。	6项单项工程与招标工程量清单一致得100%权重分，否则，有	根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单，项目道路工程、污水工程、雨水工程3项的完成情况与计划工程量基本一致，但电力工程、照明工程、交通工程完成情况与计划工程量存在偏差较大，如：电力管沟	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							一项不符合扣权重分的 1/6。	管道计划敷设 16294m，实际完成 15474m；照明工程计划新安装 45 套，实际未完成；交通工程中各项标志牌安装及更换计划 52 套，实际完成 7 套，信号灯计划 33 套，实际完成 6 套等（详见附件 3）。依据评分标准，扣权重分的 3/6，本项指标得 2.00 分。	
		C1.2 给水工程 实际完成	2.00	考察该项目给水工程完成情况与计划是否一致。	100%	评价要点：给水工程完成情况与招标工程量清单一致。	与招标工程量清单一致得 100% 权重分，否则，	根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单，项目给水工程完成情况与计划工程量基本一致。依据评分标准，本项指标得 2.00 分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		情况					每发现一处不一致，扣权重分的5%，扣完为止。		
		C1.3 绿化工程 实际 完成 情况	2.00	考察该项目绿化工程完成情况与计划是否一致。	100%	评价要点：绿化工程完成情况与招标工程量清单一致。	与招标工程量清单一致得100%权重分，否则，每发现一处不一致，扣权	根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单，项目绿化工程中栽种绿植数量及面积与计划量均不一致，如：造型油松计划数量44株，实际完成17株，红叶石楠树计划38株，实际完成16株；金森女贞计划278m ² ，实际完成25m ² 等（详见附	0.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							重分的5%，扣完为止。	件3)。依据评分标准，本项指标得0.00分。	
		C1.4 灌溉工程 实际完成 情况	2.00	考察该项目灌溉工程完成情况与计划是否一致。	100%	评价要点：灌溉工程完成情况与招标工程量清单一致。	与招标工程量清单一致得100%权重分，否则，每发现一处不一致，扣权重分的5%，扣完为止。	根据项目单位提供的竣工验收证书及招标工程量清单，灌溉工程完成情况与计划工程量基本一致。依据评分标准，本项指标得2.00分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
	C2 产出质量 (10分)	C2.1 项目验收合格情况	5.00	考察该项目已完成验收合格情况。用于反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	合格	评价要点：本项目共分为3个施工标段，均验收合格。	项目验收均合格得100%权重分，否则，有一项存在问题扣权重分的1/3。	经评价组查阅项目单位提供的竣工验收资料，建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位等参与项目验收，3个标段均验收合格。依据评分标准，本项指标得5.00分。	5.00
		C2.2 工程安全事故发生次数	5.00	考察该项目施工过程中是否发生安全事故。	0次	评价要点：项目在实施过程中，发生工程安全事故问题。	未出现工程安全事故，得满分；出现工程安全事故问	根据收集的基础数据资料及访谈情况，该项目在实施过程中，并未发生工程安全事故问题。依据评分标准，本项指标得5.00分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							题，不得分。		
	C3 产出时效 (5 分)	C3.1 项目完成及时性	5.00	考察项目是否按照计划有效实施，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	评价要点：项目是否按照合同计划工期完成建设工作。	在合同计划工期内完工得 100% 权重分，每超出合同计划工期时间一天，扣权重分	经评价组核查项目相关资料，1 标段合同约定工期为 365 日历天，2 标段、3 标段合同约定工期均为 60 日历天，该项目 3 个标段均在计划工期内完成施工。依据评分标准，本项指标得 5.00 分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							的 5%，扣完为止。		
	C4 产出成本 (5 分)	C4.1 项目成本控制有效性	5.00	考察项目实施过程中，预算单位对于项目成本控制是否有效。	有效	评价要点：项目建设成本在财政预算资金范围内，不超出财政预算安排。	不超出财政预算安排得 100% 权重分，否则不得分。	经评价组核查项目相关资料，项目招标控制总价为 2,780.20 万元，中标总金额为 2,507.92 万元，成本控制有效。综上，本项指标得 5.00 分。	5.00
D 效益 (30 分)	D1 社会效益 (15 分)	D1.1 完善区域内路网	5.00	考察项目实施后，是否改造原有道路建设基础条件。	完善	评价要点：①道路是否设立有路标路牌和交通安全警示标志等；②机动车道、非机动车道、人行道区域划分明确，确保分	三项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分	经评价组核查项目资料及现场调研：①道路均设有路标路牌和交通警示标志，要点①得满分；②机动车道、非机动车道、人行道区域划分明确，确保了分道通行，要点②得满分；③该项目实	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						道通行；③项目实施区域内无明显破损等安全隐患。	的 1/3 权重分。	施区域内无明显破损等安全隐患，要点③得满分。综上，本项指标得 5.00 分。	
		D1.2 解决城市内涝问题	5.00	考察项目实施后，对解决城市内涝问题的影响。	≥90%	评价要点：通过问卷调查，周边群众认为项目实施后对有效解决城市内涝问题应达到 90%以上。	通过问卷调查，对解决城市内涝问题满意度达到 90%，得 100% 权重分，否则，每低于目标值 1%，扣	通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷 147 份。评价组通过分析问卷，对解决城市内涝问题的满意程度为 86.05%。依据评分规则，本项指标得 $5 \times [1 - (90\% - 86.05\%) \times 5\%] = 4.01$ 分。	4.01

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							权重分的5%，扣完为止。		
		D1.3 道路通行能力提升情况	5.00	考察项目实施后，对改善道路出行便捷程度是否有效。	≥90%	评价要点：通过问卷调查，周边群众认为项目实施后对道路通行能力提升的满意程度应达到90%以上。	通过问卷调查，有90%以上的群众认为道路通行能力有提升，得100%权重分，否则，每低于目标值1%，	通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷147份。评价组通过分析问卷，对道路通行能力提升的满意程度为90.31%。依据评分规则，本项指标得5.00分。	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							扣权重分的 5%，扣完为止。		
	D2 可持续影响（6分）	D2.1 长效管理机制健全性	6.00	考察项目后续道路及绿化工程管护计划合理性、管护责任明确性等机制健全情况。	健全	评价要点：①是否有道路及绿化相关管护计划；②管护计划是否合理；③管护责任是否有明确划分。	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	合同约定该项目道路工程完工后由项目施工单位管护一年，后移交高新区执法局，绿化工程完工后由施工单位管护两年，后移交高新区城市绿化行政主管部门进行管护。评价组通过核查项目资料，并经现场访谈了解：道路工程于 2023 年 7 月竣工验收，截至评价期结束，因路灯设施不完善暂未办理交接手续；绿化工程于 2024 年 4 月竣工验收，目	6.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								前在施工单位管护期间。高新区城市绿化行政主管部门目前正在完善园林绿化管理的相关考核办法，办法中明确管护责任方，并对其养护和管理工作设有详细的考核标准。综上，本项指标得 6.00 分。	
	D3 满意度(9分)	D3.1 群众满意度	9.00	考察项目区域群众对该项目建设的满意程度。	≥90%	采取问卷调查的方式，满意度应达到90%以上。	满意度达到90%及以上得100%权重分，否则，每低于目标值1%，	通过问卷调查方式，到目前为止，共发放并回收有效问卷147份。评价组通过分析问卷，项目区域群众对该项目建设的综合满意程度为88.88%。依据评分规则，本项指标得 $9 \times [1 - (90\% - 88.88\%) \times 5\%] = 8.50$ 分。	8.50

一级 指标	二级 指标	三级 指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							扣权重分的 5%，扣完为止。		
合计			100.00						85.57

附件 2：满意度调查分析报告

新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程 项目绩效评价满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为高新区海河路（新原路-新飞大道）周边区域群众。

（二）调研内容

了解该道路的建设实施对周边区域群众产生的影响；了解周边群众对该项目的实施及项目实施后产出效果的满意度情况。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用网络填写调查问卷的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请调研对象在线填写问卷。到目前为止，共收回有效问卷 147 份。

四、调查问卷分析

1.您的年龄段是：

选项	小计	比例
A.0-19 岁	0	0.00%
B.20-39 岁	100	68.03%
C.40-59 岁	47	31.97%
D.60-79 岁	0	0.00%
E.80 岁及以上	0	0.00%
合计	147	

2.您对高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程项目了解吗？

选项	小计	比例
A.了解	93	63.27%
B.一般	43	29.25%
C.不了解	11	7.48%
合计	147	

3.您关注新乡高新区海河路（新原路-新飞大道）城市道路工程的建设进度吗？

选项	小计	比例
A.非常关心	76	51.70%
B.较为关心	46	31.29%
C.偶尔关心	17	11.56%
D.不关心	8	5.44%
合计	147	

4.您认为该道路的建成对当地产生那些方面的影响：

选项	小计	比例
A.使交通便利	132	89.80%
B.促进旅游业发展	2	1.36%


选项	小计	比例
C.更多商机	8	5.44%
D.美化环境	5	3.40%
E.破坏生态	0	0.00%
F.其他	0	0.00%
合计	147	

5.您对该道路的绿化工程效果是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
88.61%	147	96	35	16	0	0
		65.31%	17.86%	5.44%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对该道路的绿化工程效果的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对该道路的绿化工程效果的满意程度为 88.61%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 65.31%，表示“比较满意”的占 23.81%，表示“一般”的占 10.88%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

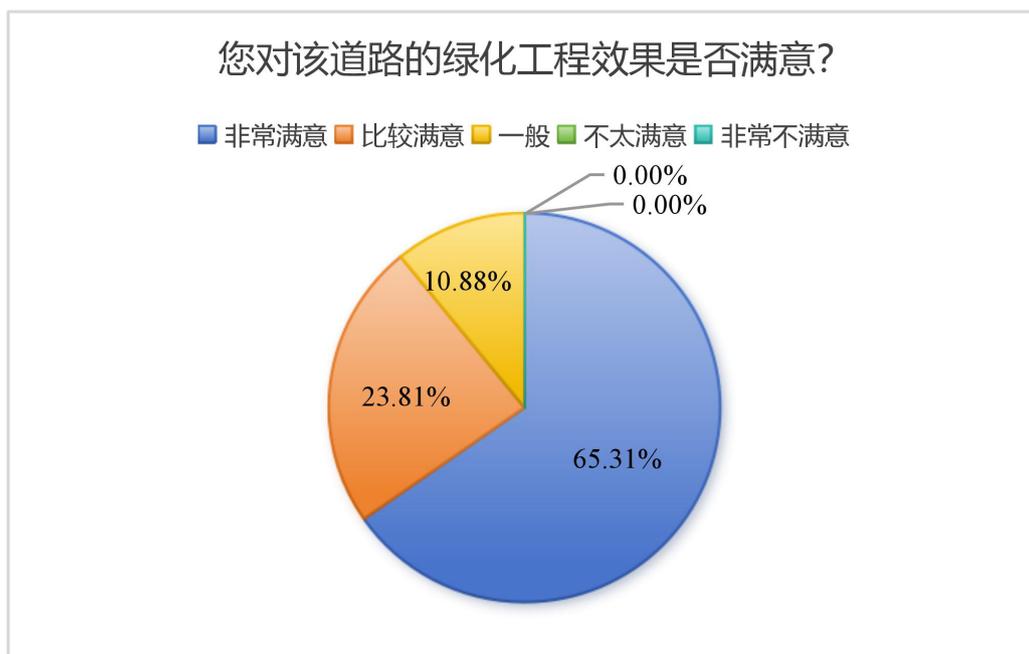


6.雨季时，您对所居住周边道路的排水效果是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
86.05%	147	92	33	18	3	1
		62.59%	16.84%	6.12%	0.51%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对该道路的排水效果方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对该道路的排水效果方面的满意程度为 86.05%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 62.59%，表示“比较满意”的占 22.45%，表示“一般”的占 12.24%，表示“不太满意”的占 2.04%，表示“非常不满意”的占 0.68%。

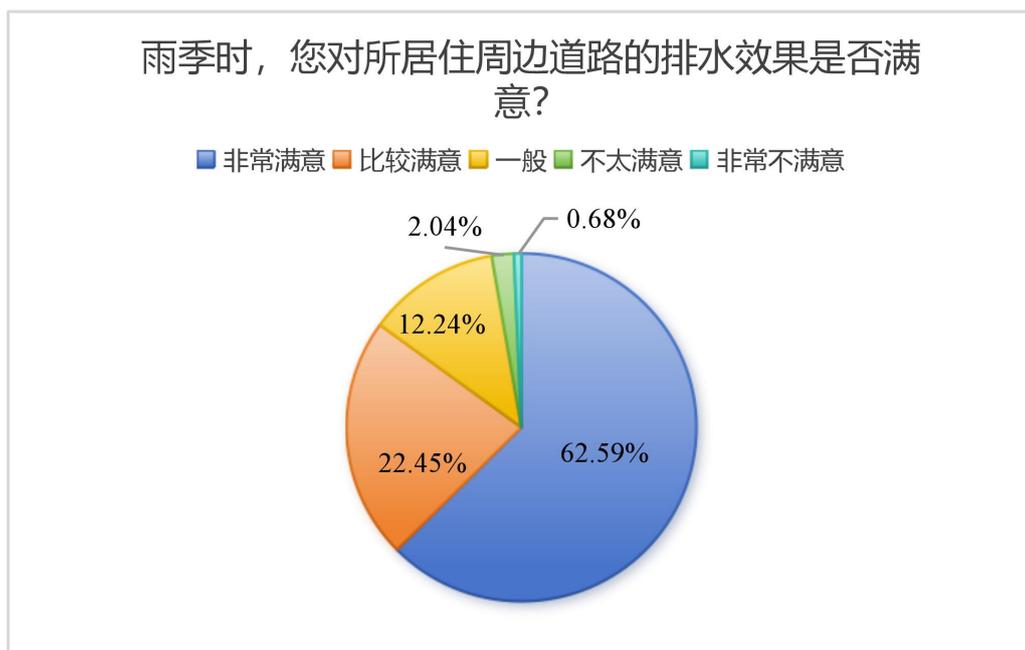


7.您对修建后的道路通行能力是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
90.31%	147	98	41	8	0	0
		66.67%	20.92%	2.72%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对修建后道路通行能力方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对修建后道路通行能力方面的满意程度为 90.31%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 66.67%，表示“比较满意”的占 27.89%，表示“一般”的占 5.44%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

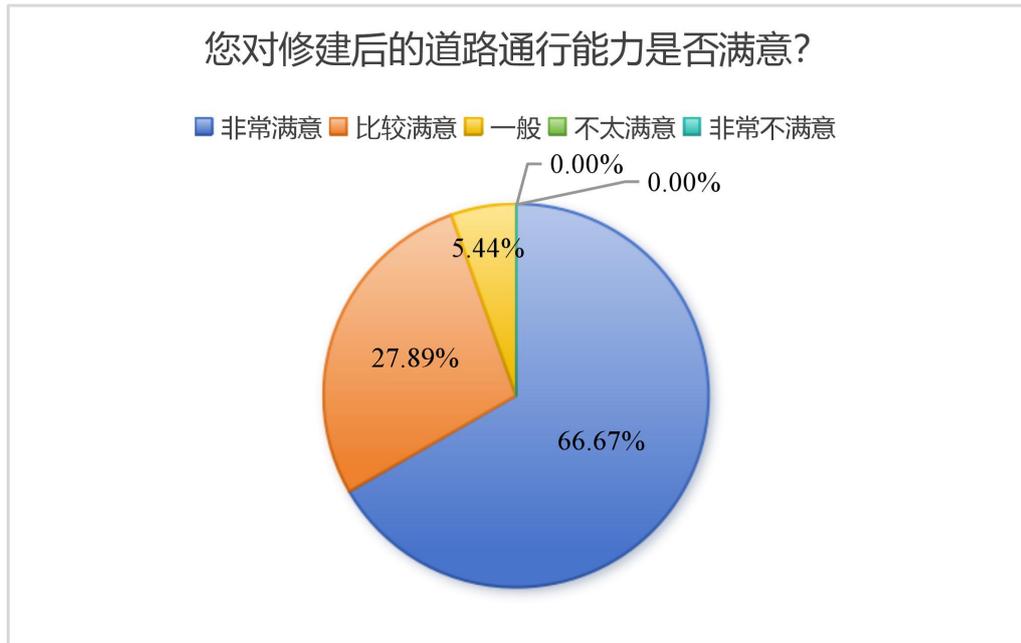


8.您对修建后的道路基础设施是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
89.46%	147	96	40	11	0	0
		65.31%	20.41%	3.74%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对修建后的道路基础设施方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对修建后的道路基础设施方面的满意程度为 89.46%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 65.31%，表示“比较满意”的占 27.21%，表示“一般”的占 7.48%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

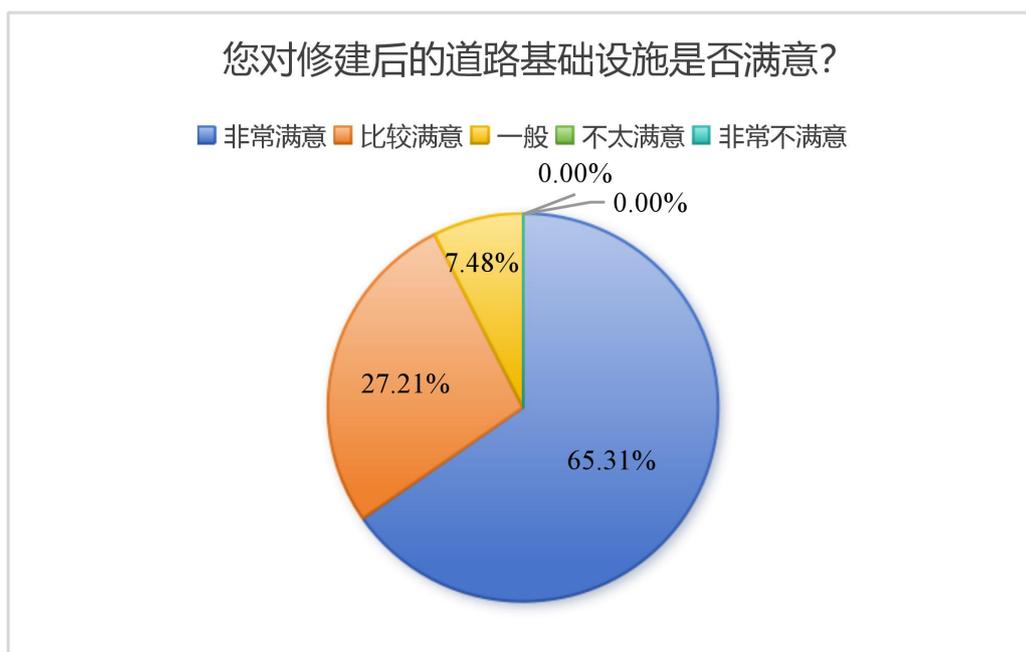


9.您对道路修建后改善周边居民的出行情况及效率是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
89.46%	147	95	42	10	0	0
		64.63%	21.43%	3.40%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对道路修建后改善周边居民的出行情况及效率方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对道路修建后改善周边居民的出行情况及效率方面的满意程度为 89.46%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 64.63%，表示“比较满意”的占 28.57%，表示“一般”的占 6.80%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

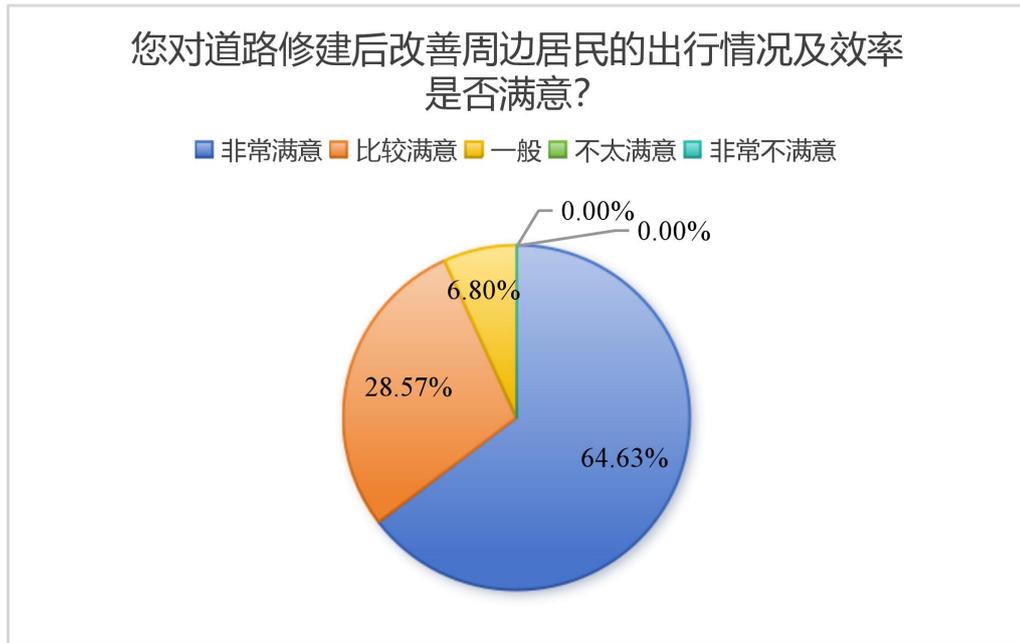


10.您对该道路在提高安全性能方面是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
89.12%	147	96	38	13	0	0
		65.31%	19.39%	4.42%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对该道路在提高安全性能方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对该道路在提高安全性能方面的满意程度为 89.12%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 65.31%，表示“比较满意”的占 25.85%，表示“一般”的占 8.84%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

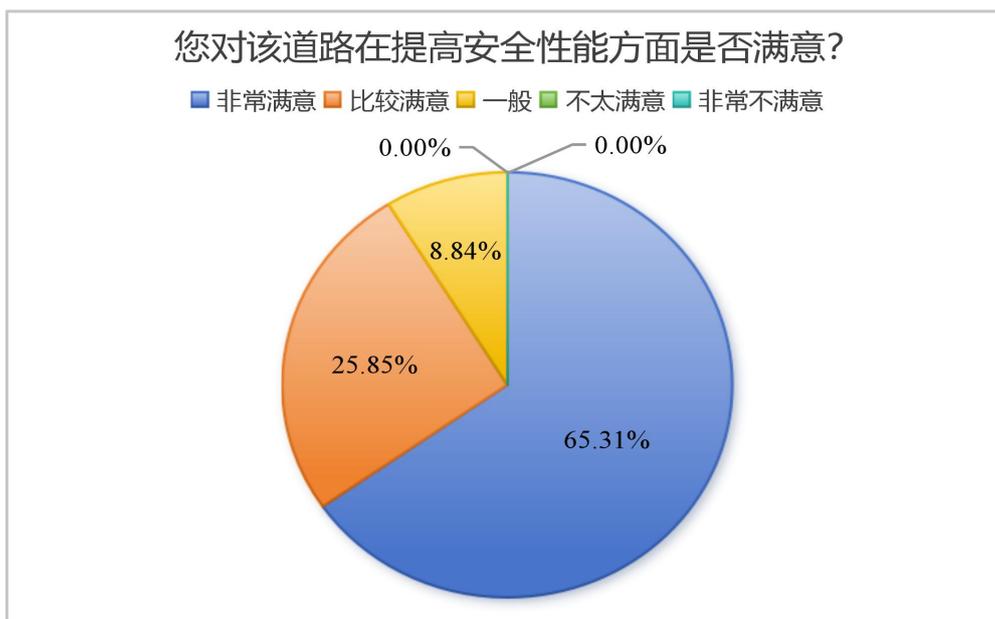


11.您对该道路养护管理的是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
89.12%	147	96	38	13	0	0
		65.31%	19.39%	4.42%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解周边群众对该道路在提高安全性能方面的满意程度，在回收的 147 份问卷中，周边群众对该道路在提高安全性能方面的满意程度为 89.12%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 65.31%，表示“比较满意”的占 25.85%，表示“一般”的占 8.84%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

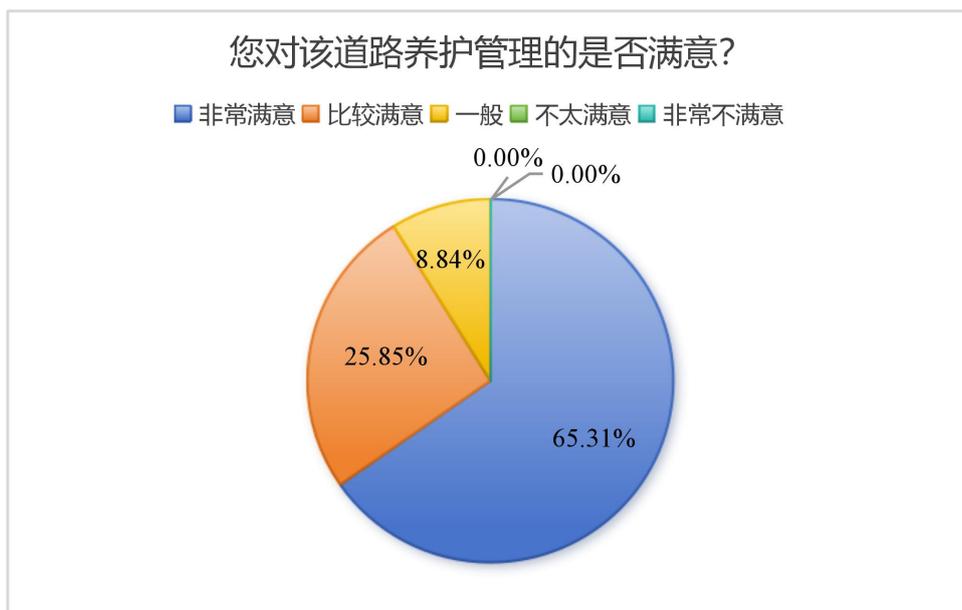

根据问卷调查结果显示，周边区域群众的整体满意程度为 88.88%。

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
1.您对该道路的绿化工程效果是否满意?	88.61%	65.31%	17.86%	5.44%	0.00%	0.00%
2.雨季时，您对所居住周边道路的排水效果是否满意?	86.05%	62.59%	16.84%	6.12%	0.51%	0.00%
3.您对修建后的道路通行能力是否满意?	90.31%	66.67%	20.92%	2.72%	0.00%	0.00%
4.您对修建后的道路基础设施是否满意?	89.46%	65.31%	20.41%	3.74%	0.00%	0.00%
5.您对道路修建后改善周边居民的出行情况及效率是否满意?	89.46%	64.63%	21.43%	3.40%	0.00%	0.00%
6.您对该道路在提高	89.12%	65.31%	19.39%	4.42%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
安全性能方面是否满意?						
7.您对该道路养护管理的是否满意?	89.12%	65.31%	19.39%	4.42%	0.00%	0.00%
综合满意度	88.88%					

12.评价组通过问卷调研,发现周边群众对该道路建设及养护方面存在以下建议或意见,建议项目相关单位予以重视,积极解决群众所关心的以下问题:

- (1) 道路车辆规范停放;
- (2) 冬季减少洒水次数;
- (3) 道路两侧绿化再丰富一些,并加强绿化管护;
- (4) 路面排水问题仍需进一步改善,雨季前及时清理排水管道,防止内涝;
- (5) 部分路段应增设路灯;
- (6) 非机动车道纵向最好不要有凹凸槽,对非机动车易造成侧翻等伤害;
- (7) 尽快修通张八寨段道路,方便市民,促进经济发展;
- (8) 周边多建一些大型商业广场,带动周边地区经济发展;
- (9) 希望高新区越来越美,越来越好!

附件 3：主要工程计划与实际完成情况对比表

标段	工程名称	施工内容	计划工程量	完工工程量	偏差情况
一标段	道路施工工程	1.道路工程			
		1.1 道路全长	713.36m	713m	0.36m
		2.污水工程			
		2.1 污水管道敷设全长	794m	794m	-
		2.2 污水检查井	24 座	24 座	-
		3.雨水工程			
		3.1 雨水管道敷设全长	1798.88m	1798m	0.88m
		3.2 雨水检查井	45 座	46 座	1 座
		4.电力工程			
		4.1 电力管沟管道敷设全长	16294m	15474m	820m
		4.2 电力井	13 座	13 座	-
		5.照明工程			
		5.1 照明保护管敷设全长	5600.13m	5600.13m	-
		5.2 路灯	45 套	-	45 套
		6.交通工程			
		6.1 交通标线	1903.1 m ²	1903 m ²	0.1 m ²
		6.2 信号灯安装	33 套	6 套	27 套
		6.3 标志牌安装	52 套	7 套	45 套
二标段	给水工程	施工段全长	682m	682m	-
		给水管 DN300 球墨铸铁管	758m	758m	-

标段	工程名称	施工内容	计划工程量	完工工程量	偏差情况
		用户支管 DN200 球墨铸铁管	153m	153m	-
		消防栓支管 DN100 球墨铸铁管	21m	21m	-
三标段	绿化工程	造型油松	44 株	17 株	27 套
		白皮松	46 株	2 株	44 株
		红叶石楠树	38 株	16 株	22 株
		法桐（无球悬铃木）	172 株	94 株	78 株
		西府海棠	-	75 株	75 株
		二乔玉兰	29 株	-	29 株
		晚樱	16 株	24 株	8 株
		紫叶矮	29 株	22 株	7 株
		榆叶梅	125 株	-	125 株
		寿星桃	37 株	-	37 株
		金叶榆球	47 株	21 株	26 株
		红叶石楠球	38 株	18 株	20 株
		大叶黄杨球	16 株	-	16 株
		狼尾	95 丛	31 丛	64 丛
		细叶芒	68 丛	21 丛	47 丛
		景石	35 块	11 块	24 块
		红叶石楠	477 m ²	100 m ²	377 m ²
金森女贞	278 m ²	25 m ²	253 m ²		

标段	工程名称	施工内容	计划工程量	完工工程量	偏差情况
		大叶黄杨	68 m ²	53 m ²	15 m ²
		小龙柏	135 m ²	34 m ²	101 m ²
		欧石竹	319 m ²	237 m ²	82 m ²
		草皮	2876 m ²	2496 m ²	380 m ²
		麦冬	-	115.8 m ²	115.8 m ²
	灌溉工程	管道	1486.23m	1487m	0.77m
		机井	1 座	1 座	-
		配电箱	1 台	1 台	-
		潜水泵	1 台	1 台	-
		砌筑井	1 座	1 座	-
